



AYUNTAMIENTO
**SANTO DOMINGO
NORTE**
"Nuestro Norte eres tú"
RNC 425000339

DIRECION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL (PPM)

Santo Domingo Norte
29 De Agosto 2018

Al : Licda. Yaciris Concepción
Encargada de la Región Ozama de (FEDOMUS.)

Vía : ING: Genrry González
Encargado de la unidad del (PPM) (FEDOMUS.)

De : Lic. Bartolo Reynoso.
Director de Presupuesto Participativo Municipio (ASDN).

Asunto : Remisión de copias de cheques y cubicaciones.

Cortésmente me dirijo a usted, con la finalidad de Remitirle las copias de seis (6) cheques correspondientes al avance y seis (6) copias de cubicaciones de las obras que detallamos a continuación:

- 1)-Terminación de la construcción de la iglesia del sector de Ceuta.
- 2)- Construcción de varios pozos con Bomba sumergible, Sector Bruno Heredia.
- 3)-Acondicionamiento de varias calles, sector Villa Germán II.
- 4)- Acondicionamiento de Aceras y Contenes, Sector Luis Manuel Caraballo II.
- 5)- Acondicionamiento de Varios pozos con Bomba Sumergible, Sector Juan Pablo Duarte.
- 6)- Acondicionamiento de las Calles, sector Rincón de Higüero.

Estas obras corresponden al plan de inversión 2017-2018 del Presupuesto Participativo Municipal.

Sin otro particular por el momento,

Atentamente,

Lic. Bartolo Reynoso

Director de Presupuesto Participativo del (ASDN)



[Handwritten signature]

30/08/18

Formulario No. 332 Ref.
del Contralor y
Auditor General



AYUNTAMIENTO
**SANTO DOMINGO
NORTE**
Ciudad Ecoturística y Cultural

Clave Municipal No.

PROGRAMA INVERSION DE OBRAS

No. 019909
DIA MES AÑO

RNC: 425-00033-9

DO61BRRD0000000000330005219

RDS

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

Cap. No.	Sub-Objeto	Fondo	Comprobante No.	Fecha	Valor
DETALLE DE LA CUENTA PAGADA			Símbolo	Unidad Organizativa	
<i>Nataly Gumbas</i> <i>225-0003420-6</i>					
TOTAL					

DISTRIBUCION: Original Al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;
Cuatriplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería.

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS RDS RD\$59,022.12
\$370,658.90

SUB-TOTAL GENERAL RDS \$1,551,101.25

Preparado por:



ING. ADDERLY CAPELLAN RAMOS
ENC. DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS


Aprobado por:



ING. RICHARD DE LOS SANTOS
DIR. OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



AYUNTAMIENTO
**SANTO DOMINGO
NORTE**
"Nuestro Norte eres tú"
RNC 425000339



DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE CUBICACION

7

PROYECTO: PARA LA TERMINACION DE CONSTRUCCION DE LA IGLESIA UBICACION: EN LA CALLE LA ESPERANZA DEL SECTOR CEUTA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, REPUBLICA DOMINICANA.
NO. 2078
CONTRATISTA: CONAMAR, SRL RNC: 131191444
PRIMERA CUBICACION

FECHA: 15/08/2018

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO							PREVIO			ACTUAL			ACUMULADO		
No.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL	%	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.00	PRELIMINARES														
1.01	Suministro e Instalacion de Valla Informatica de 10'x 5'' con Tubo Negro de 2 con perfil de 1")	1.00	P.A.	15,000.00	15,000.00					100.00%	1.00	15,000.00	100.00%	1.00	15,000.00
1.02	Suministro, Regado y Nivelado de Material (Caliche), para la Nivelacion del Piso e=0.10mts	18.60	M3	450.00	8,370.00					100.00%	18.60	8,370.00	100.00%	18.60	8,370.00
						23,370.00								0.00	0.00
2.00	HORMIGON ARMADO SOBRE NIVEL DE PISO														
2.01	Vaciado de Hormigon en Columnas C1 (0.45x0.45), h=2.20 mts	4.91	M3	7,993.10	39,246.10					100.00%	4.91	39,246.10	100.00%	4.91	39,246.10
2.02	Vaciado de Hormigon en Columnas C2 (0.20x0.20), h=3.20	0.52	M3	14,011.62	7,286.04					100.00%	0.52	7,286.04	100.00%	0.52	7,286.04
2.03	Viga de amarre (0.20x0.30)mts 4Ø3/4" - 2ø3/8"est.Ø3/8"@0.20m; Long=64.38mts	3.87	M3	21,654.62	83,803.36					100.00%	3.87	83,803.36	100.00%	3.87	83,803.36
2.04	Viga Estructural (0.25x0.30)mts 5Ø1" - 2ø3/4"est.Ø3/8"@0.10 y 0.15 #Cantidad de Viga= 3	2.13	M3	31,792.68	67,718.40					100.00%	2.13	67,718.40	100.00%	2.13	67,718.40
2.05	Dinteles (0.20x0.20), 4ø3/8" + estø3/8"@0.20 m ; Long=54.00mts	2.16	M3	19,654.62	42,453.97					100.00%	2.16	42,453.97	100.00%	2.16	42,453.97
2.06	Losa H.A. e=0.12mts Ø3/8"@0.20m A.D. Hormigon Industrial f'c= 210Kg/cm2	22.13	M3	13,215.65	292,462.37					91.60%	20.27	267,881.26	91.60%	20.27	267,881.26
						532,970.24									
3.00	MAMPOSTERIA														
3.01	Muros de 8" con bastones 3/8"@0.80m SNP	40.10	M2	1,182.00	47,398.19					100.00%	40.10	47,398.19	100.00%	40.10	47,398.19
3.02	Construccion de Muros de 6" para Antepecho	13.66	M2	841.88	11,503.40					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
						58,901.59								0.00	0.00



AYUNTAMIENTO
**SANTO DOMINGO
NORTE**
"Nuestro Norte eres tú"
RNC 425000339

TOTAL GENERAL CUBICADO												732,054.86			732,054.86
Amortización del Avance Inicial por un monto de RDS310,220.25	20.00%					310,220.25									
SUB TOTAL DESCUENTO DEL AVANCE	50.00%											155,110.12			155,110.12
TOTAL GENERAL A PAGAR												576,944.73			576,944.73
												MONTO PRESUPUESTADO	1,551,101.25		
												MONTO CUBICADO	732,054.86		
												% EJECUTADO	47%		



2

Aprobado por el Contralor y
Auditor General



AYUNTAMIENTO
**SANTO DOMINGO
NORTE**
Ciudad Ecológica y Cultural

PROGRAMA INVERSION DE OBRAS

RNC: 425-00033-9
DO61BRD000000000000330005219

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

001-029976A-0

Cap. No.	Sub-Objeto	Fondo	Comprobante No.	Fecha	Valor
DETALLE DE LA CUENTA PAGADA			Símbolo	Unidad Organizativa	
001-029976A-0					
Severiano Herrera Valdez					
TOTAL					

DISTRIBUCION: Original Al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;
Cuatriplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería.



ALEJANDRO TIBURCIO GUERRA
ENC. CONTABILIDAD

JOSE ANTONIO POLANCO ROSA

Regidor/a

(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)



JUAN RAFAEL SANTAMARÍA

ERASMO GILBERTO NO ROSA

RENE

ALCALDE



FECHA: 1995
REGISTRO: 067
CAJERA:

Total General RD\$

310,218.48

Retenciones

%

[Handwritten signature]



AYUNTAMIENTO
**SANTO DOMINGO
NORTE**
"Nuestro Norte eres tú"
RNC 425000339



DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE CUBICACION

PROYECTO: PARA LA CONSTRUCCION DE VARIOS POZOS CON BOMBA SUMERGIDA UBICACION: EN EL SECTOR SANTA CRUZ I, BRUNO HEREDIA, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE.
NO. 2080
CONTRATISTA: SEVERIANO HERREÑA VALDEZ
PRIMERA CUBICACION
RNC: 001-0299764-0

PRESUPUESTO

FECHA: 01/08/2018

						PREVIO			ACTUAL			ACUMULADO		
						%	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.00	PRELIMINARES													
1.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA DE 10' X 5' (TUBO NEGRO DE 2" CON PERFIL DE I)	1.00	UNID	15,000.00	15,000.00				100.00%	1.00	15,000.00	100.00%	1.00	15,000.00
2.00	CONSTRUCCION DE BOMBA SUMERGIBLE EN LA CALLE POLICARPIO HEREDIA				RDS15,000.00				100.00%	1.00	15,000.00	100.00%	1.00	15,000.00
A	TRABAJOS DE PLOMERIA													
2.01	PERFORACION DE POZO DE 6" Long=175.00Pie	1.00	P.A.	33,000.00	33,000.00									
2.02	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBO SDR41 DE 6"	9.00	UNID	3,400.00	30,600.00	100.00%	1.00	33,000.00	100.00%	1.00	33,000.00	100.00%	1.00	33,000.00
2.03	BOMBA SUMERGIBLE 2HP	1.00	UD	32,465.41	32,465.41	88.89%	8.00	27,200.00	88.89%	8.00	27,200.00	88.89%	8.00	27,200.00
2.04	MANGUERA DE POLIETILENO PN6 1"	175.00	PIE	60.90	10,657.50	100.00%	1.00	32,465.41	100.00%	1.00	32,465.41	100.00%	1.00	32,465.41
2.05	CABLE SOSTENDOR	175.00	PIE	24.64	4,312.00	88.57%	155.00	9,439.50	88.57%	155.00	9,439.50	88.57%	155.00	9,439.50
2.06	CABEZAL DE POZO	1.00	UD	1,800.00	1,800.00	88.57%	155.00	3,819.20	88.57%	155.00	3,819.20	88.57%	155.00	3,819.20
2.07	TANQUE PRESURIZADO de 60 gls	1.00	UD	11,500.00	11,500.00	100.00%	1.00	1,800.00	100.00%	1.00	1,800.00	100.00%	1.00	1,800.00
3.00	ACCESORIOS PLOMERIA				124,334.91	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
3.01	TUBOS DE 1 1/2" PVC PRESION	1.00	UNID	650.00	650.00									
3.02	LLAVE DE BOLA 1 1/2" ROSCADA	2.00	UNID	800.00	1,600.00	100.00%	1.00	650.00	100.00%	1.00	650.00	100.00%	1.00	650.00
3.03	TE "T" 1 1/2" PVC	2.00	UNID	38.01	76.02	100.00%	2.00	1,600.00	100.00%	2.00	1,600.00	100.00%	2.00	1,600.00
3.04	CODOS DE PVC 2X90	2.00	UNID	95.00	190.00	100.00%	2.00	76.02	100.00%	2.00	76.02	100.00%	2.00	76.02
3.05	CODOS DE PVC 2X45	2.00	UNID	85.00	170.00	100.00%	2.00	190.00	100.00%	2.00	190.00	100.00%	2.00	190.00
3.06	CODOS DE 1 1/2X45 PVC	2.00	UNID	73.01	146.02	100.00%	2.00	170.00	100.00%	2.00	170.00	100.00%	2.00	170.00
3.07	CHEQUE DE 2 HORIZONTAL	1.00	UNID	850.00	850.00	100.00%	1.00	146.02	100.00%	1.00	146.02	100.00%	1.00	146.02
3.08	ADAPTADOR TIPO CODO 90	4.00	UNID	170.00	680.00	100.00%	4.00	850.00	100.00%	4.00	850.00	100.00%	4.00	850.00
3.09	CLIC ALAMBRE SUJETADOR BOMBA	1.00	UNID	4.00	4.00	100.00%	1.00	170.00	100.00%	1.00	170.00	100.00%	1.00	170.00
3.10	NIPLE ACERO 1 1/2 X4	1.00	UNID	150.00	150.00	100.00%	4.00	16.90	100.00%	4.00	16.90	100.00%	4.00	16.90
3.11	M.O PLOMERIA	1.00	P.A.	12,000.00	12,000.00	100.00%	1.00	150.00	100.00%	1.00	150.00	100.00%	1.00	150.00
4.00	INSTALACION ELECTRICA				16,018.04									
4.01	ALAMBRE TRIPLEX #10	150.00	PIE	56.00	8,400.00	100.00%	150.00	8,400.00	100.00%	150.00	8,400.00	100.00%	150.00	8,400.00
4.02	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO	1.00	UD	450.00	450.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
4.03	SALIDA DE LUZ CENTRAL	1.00	UD	450.00	450.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
4.04	CAMPANAS	2.00	UDS	600.00	1,200.00	100.00%	2.00	1,200.00	100.00%	2.00	1,200.00	100.00%	2.00	1,200.00
4.05	GRAPA TERMINAL	4.00	UDS	600.00	2,400.00	100.00%	4.00	2,400.00	100.00%	4.00	2,400.00	100.00%	4.00	2,400.00

2

Aprobado por el Contralor y
Auditor General



AYUNTAMIENTO
**SANTO DOMINGO
NORTE**
Ciudad Ecológica y Cultural

PROGRAMA INVERSION DE OBRAS

RNC: 425-00033-9

DO61BRD000000000000330005219

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

310,218.48

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

457087000 214 1127 27 130003300005219

Cap. No.	Sub-Objeto	Fondo	Comprobante No.	Fecha	Valor
DETALLE DE LA CUENTA PAGADA			Símbolo	Unidad Organizativa	
001-029976A-0					
Severiano Herrera Valdez					
TOTAL					

DISTRIBUCION: Original Al Interesado; Duplicado y Tríplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;
Cuatríplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería.



ALEJANDRO TIBURCIO GUERRA
ENC. CONTABILIDAD

JOSE ANTONIO POLANCO ROSA

Regidor/a

(solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)



JUAN RAFAEL TENDERA MONTES

ERASMO GILBERTO ROSARIO

RENE

ALCALDE



Total General RD\$

310,218.48

Retenciones

%

[Handwritten signature]



AYUNTAMIENTO
**SANTO DOMINGO
NORTE**
"Nuestro Norte eres tú"
RNC 425000339



DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE CUBICACION

PROYECTO: PARA LA CONSTRUCCION DE VARIOS POZOS CON BOMBA SUMERGIDA UBICACION: EN EL SECTOR SANTA CRUZ I, BRUNO HEREDIA, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE.
NO. 2080
CONTRATISTA: SEVERIANO HERREIRA VALDEZ
PRIMERA CUBICACION


RNC: 001-0299764-0

PRESUPUESTO

FECHA: 01/08/2018

CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	%
1.00	PRELIMINARES													
1.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA DE 10' X 5' (TUBO NEGRO DE 2" CON PERFIL DE 1")		1.00	15,000.00	100.00%	1.00	15,000.00	100.00%	1.00	15,000.00	100.00%	1.00	15,000.00	100.00%
2.00	CONSTRUCCION DE BOMBA SUMERGIBLE EN LA CALLE POLICARPIO HEREDIA													
A	TRABAJOS DE PLOMERIA													
2.01	PERFORACION DE POZO DE 6" Long=175.00Pie		1.00	33,000.00	100.00%	1.00	33,000.00	100.00%	1.00	33,000.00	100.00%	1.00	33,000.00	100.00%
2.02	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBO SDR41 DE 6"		9.00	3,400.00	100.00%	9.00	3,400.00	100.00%	9.00	3,400.00	100.00%	9.00	3,400.00	100.00%
2.03	BOMBA SUMERGIBLE 2HP		1.00	32,465.41	100.00%	1.00	32,465.41	100.00%	1.00	32,465.41	100.00%	1.00	32,465.41	100.00%
2.04	MANGUERA DE POLIETILENO PN6 1"		175.00	60.90	100.00%	175.00	60.90	100.00%	175.00	60.90	100.00%	175.00	60.90	100.00%
2.05	CABLE SOSTENDOR		175.00	24.64	100.00%	175.00	24.64	100.00%	175.00	24.64	100.00%	175.00	24.64	100.00%
2.06	CABEZAL DE POZO		1.00	1,800.00	100.00%	1.00	1,800.00	100.00%	1.00	1,800.00	100.00%	1.00	1,800.00	100.00%
2.07	TANQUE PRESURIZADO de 60 gls		1.00	11,500.00	100.00%	1.00	11,500.00	100.00%	1.00	11,500.00	100.00%	1.00	11,500.00	100.00%
3.00	ACCESORIOS PLOMERIA													
3.01	TUBOS DE 1 1/2" PVC PRESION		1.00	650.00	100.00%	1.00	650.00	100.00%	1.00	650.00	100.00%	1.00	650.00	100.00%
3.02	LLAVE DE BOLA 1 1/2" ROSCADA		2.00	800.00	100.00%	2.00	800.00	100.00%	2.00	800.00	100.00%	2.00	800.00	100.00%
3.03	TE "T" 1 1/2" PVC		2.00	38.01	100.00%	2.00	38.01	100.00%	2.00	38.01	100.00%	2.00	38.01	100.00%
3.04	CODOS DE PVC 2X90		2.00	95.00	100.00%	2.00	95.00	100.00%	2.00	95.00	100.00%	2.00	95.00	100.00%
3.05	CODOS DE PVC 2X45		2.00	85.00	100.00%	2.00	85.00	100.00%	2.00	85.00	100.00%	2.00	85.00	100.00%
3.06	CODOS DE 1 1/2X45 PVC		2.00	73.01	100.00%	2.00	73.01	100.00%	2.00	73.01	100.00%	2.00	73.01	100.00%
3.07	CHEQUE DE 2 HORIZONTAL		1.00	850.00	100.00%	1.00	850.00	100.00%	1.00	850.00	100.00%	1.00	850.00	100.00%
3.08	ADAPTADOR TIPO CODO 90		1.00	170.00	100.00%	1.00	170.00	100.00%	1.00	170.00	100.00%	1.00	170.00	100.00%
3.09	CLIC ALAMBRE SUJETADOR BOMBA		4.00	4.00	100.00%	4.00	4.00	100.00%	4.00	4.00	100.00%	4.00	4.00	100.00%
3.10	NIPLE ACERO 1 1/2 X4		1.00	150.00	100.00%	1.00	150.00	100.00%	1.00	150.00	100.00%	1.00	150.00	100.00%
3.11	M O PLOMERIA		1.00	12,000.00	100.00%	1.00	12,000.00	100.00%	1.00	12,000.00	100.00%	1.00	12,000.00	100.00%
4.00	INSTALACION ELECTRICA													
4.01	ALAMBRE TRIPLEX #10		150.00	56.00	100.00%	150.00	56.00	100.00%	150.00	56.00	100.00%	150.00	56.00	100.00%
4.02	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO		1.00	450.00	100.00%	1.00	450.00	100.00%	1.00	450.00	100.00%	1.00	450.00	100.00%
4.03	SALIDA DE LUZ CENTRAL		1.00	450.00	100.00%	1.00	450.00	100.00%	1.00	450.00	100.00%	1.00	450.00	100.00%
4.04	CAMPANAS		2.00	600.00	100.00%	2.00	600.00	100.00%	2.00	600.00	100.00%	2.00	600.00	100.00%
4.05	GRAPA TERMINAL		4.00	600.00	100.00%	4.00	600.00	100.00%	4.00	600.00	100.00%	4.00	600.00	100.00%

Ave. Hermanas Mirabal, Esq. Gral. Modesto Díaz, Urb. Máximo Gómez, Sto. Dgo. Norte, R. D. • Tel.: 809-337-7177





DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Formulario No.332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General



AYUNTAMIENTO
**SANTO DOMINGO
NORTE**
Ciudad Ecológica y Cultural

Clave Municipal No.

No. 019915

DIA MES AÑO

RNC: 22500033-9

DO61BRD000000000000330005219

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

BanReservas

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

0019915 225000330005219

Cap. No.

Sub-Objeto

Fondo

Comprobante No.

Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

PAGO POR CONCEPTO DE AVANCE DEL 20% DEL MONTO DE PAGA DEL PRESUPUESTO DEL 2017
EN UN/52/2017 PARA EL ALUMBRADO DE LAS CALLES EN LA VILLA GRAN MANA
BARANA PERDIDA SANTO DOMINGO NORTE, SEGUN ANEXO

Yohanna Pérez

225-0039117-6

DISTRIBUCION: Original Al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;
Cuatriplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería.

TOTAL

EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR LO CUAL HAY QUE REGISTRAR EL CONTRATO ANTES DE PROCEDER AL
AL PAGO SOLICITADO.

Evaluado por: ARO. ROSA MARYLIN SANCHEZ NIVAR

Fecha Evaluacion: 07/05/2017

Revisado por: LIC. RAFAEL RODRIGUEZ

Fecha Revision: 07/05/2017

Entregado a:

Fecha:



[Handwritten signature]



AYUNTAMIENTO
**SANTO DOMINGO
NORTE**
"Nuestro Norte eres tú"
RNC 425000339



DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE CUBICACION

PROYECTO: PARA EL ACONDICIONAMIENTO
NO. 2067
CONTRATISTA: ING. YOHANNA PEREZ GONZALEZ
PRIMERA CUBICACION

UBICACION :EN LAS CALLES EN EL SECTOR VILLA GERMAN II, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE.

RNC: 225-0039117-6

FECHA: 02/08/2018

PRESUPUESTO						PREVIO				ACTUAL			ACUMULADO		
NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL	%	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.0	PRELIMINARES														
1.1	SUM E INST. DE VALLA INFORMATIVA DE 10**5' (TUBO NEGRO DE 2" CON PERFIL DE 1")	1.00	UNID.	15,000.00	15,000.00	15,000.00				100.00%	1.00	15,000.00	100.00%	1.00	15,000.00
2.00	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES														
2.10	CALLE FLOR DE PRIMAVERA (Long=189.40m; Ancho Promedio=5.50m)														
2.11	REPLANTEO DE CONTENES (Long=170mts)x2	340.00	ML	20.00	6,800.00					100.00%	340.00	6,800.00	100.00%	340.00	6,800.00
2.12	EXCAVACION DE CONTEN (170.00x0.30x0.20)x 2	20.40	M3	345.46	7,047.38					100.00%	20.40	7,047.38	100.00%	20.40	7,047.38
2.13	EXCAVACION DE ACERA (170.00x1.00x0.10)x2	34.00	M3	345.46	11,745.64					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
2.14	BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	65.28	M3	325.00	21,216.00					37.50%	24.48	7,956.00	37.50%	24.48	7,956.00
2.15	TELFORD PARA CONTENES	20.40	M3	1,297.22	26,463.29					100.00%	20.40	26,463.29	100.00%	20.40	26,463.29
2.16	CONSTRUCCION DE CONTENES PULIDO FC=180KG/CM2 B=0.30M H=0.50M	340.00	ML	820.25	278,885.00					100.00%	340.00	278,885.00	100.00%	340.00	278,885.00
2.17	RELLENO BAJO ACERA (170.00x1.00x0.10)x2	34.00	M3	650.00	22,100.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
2.18	CONSTRCCION DE ACERAS FLOTADAS Y VIOLINADAS FC=210KG/CM2 E.O.10M	340.00	M2	700.35	238,119.00					100.00%	340.00	238,119.00	100.00%	340.00	238,119.00
						612,376.31									
3.00	ACONDICIONAMIENTO														
3.10	CALLE HERMANA MIRABAL (Long=135.00m; Ancho Promedio=7.10m)														
3.11	LIMPIEZA CON EQUIPO (135.00x7.10x0.10)m	95.85	M3	150.00	14,377.50					100.00%	95.85	14,377.50	100.00%	95.85	14,377.50
3.12	BOTE DE MATERIAL	115.02	M3E	325.00	37,381.50					100.00%	115.02	37,381.50	100.00%	115.02	37,381.50
3.13	SUMINISTRO DE MATERIAL (CALICHE) REGADO NIVELADO Y COMPACTADO (135.00x7.10x0.15)m	143.78	M3C	650.00	93,457.00					100.00%	143.78	93,457.00	100.00%	143.78	93,457.00
						145,216.00									

Formulario No.332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General



AYUNTAMIENTO
**SANTO DOMINGO
NORTE**
Ciudad Ecológica y Cultural

Clave Municipal No.

No. 019915
DIA MES AÑO

RNC: 42500033-9

DO61BRD00000000000330005219

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

BanReservas

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

0019915 2250039117-6

Cap. No.

Sub-Objeto

Fondo

Comprobante No.

Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

PAGO POR CONCEPTO DE AVANCE DEL 20% DEL MONTO DE INICIACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL
DIA 05/02/2017 PARA EL ALAMBRILLADO DE LAS CALLES EN EL SECTOR VILLA GERMANIA.
BARAHUA PERDIDA SANTO DOMINGO NORTE, SEGUN APROBADO.

Yohanna Pérez
225-0039117-6

DISTRIBUCION: Original Al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;
Cuatriplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería.

TOTAL

EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR LO CUAL HAY QUE REGISTRAR EL CONTRATO ANTES DE PROCEDER AL
AL PAGO SOLICITADO.

Evaluated por: ARQ. ROSA MARYLIN SANCHEZ NIVAR

Fecha Evaluación: 07/05/2017

Revisado por: LIC. RAFAEL RODRIGUEZ

Fecha Revision: 07/05/2017

Entregado a:

Fecha:



[Handwritten signature]



AYUNTAMIENTO
**SANTO DOMINGO
NORTE**
"Nuestro Norte eres tú"
RNC 425000339



DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE CUBICACION

PROYECTO: PARA EL ACONDICIONAMIENTO
NO. 2067
CONTRATISTA: ING. YOHANNA PÉREZ GONZALEZ
PRIMERA CUBICACION

UBICACION :EN LAS CALLES EN EL SECTOR VILLA GERMAN II, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE.


RNC: 225-0039117-6

FECHA: 02/08/2018

		PRESUPUESTO						PREVIO		ACTUAL		ACUMULADO			
NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL	%	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.0	PRELIMINARES														
1.1	SUM E INST. DE VALLA INFORMATIVA DE 10"X5" (TUBO NEGRO DE 2" CON PERFIL DE 1")	1.00	UNID.	15,000.00	15,000.00					100.00%	1.00	15,000.00	100.00%	1.00	15,000.00
2.00	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES					15,000.00									
2.10	CALLE FLOR DE PRIMAVERA (Long=189.40m; Ancho Promedio=5.50m)														
2.11	REPLANTEO DE CONTENES (Long=170mts)x2	340.00	ML	20.00	6,800.00					100.00%	340.00	6,800.00	100.00%	340.00	6,800.00
2.12	EXCAVACION DE CONTEN (170.00x0.30x0.20)x 2	20.40	M3	345.46	7,047.38					100.00%	20.40	7,047.38	100.00%	20.40	7,047.38
2.13	EXCAVACION DE ACERA (170.00x1.00x0.10)x2	34.00	M3	345.46	11,745.64										
2.14	BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	65.28	M3	325.00	21,216.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
2.15	TELFORD PARA CONTENES	20.40	M3	1,297.22	26,463.29					37.50%	24.48	7,956.00	37.50%	24.48	7,956.00
2.16	CONSTRUCCION DE CONTENES PULIDO FC=180KG/CM2 B=0.30M H=0.50M	340.00	ML	820.25	278,885.00					100.00%	20.40	26,463.29	100.00%	20.40	26,463.29
2.17	RELLENO BAJO ACERA (170.00x1.00x0.10)x2	34.00	M3	650.00	22,100.00					100.00%	340.00	278,885.00	100.00%	340.00	278,885.00
2.18	CONSTRCCION DE ACERAS FLOTADAS Y VIOLINADAS FC=210KG/CM2 E.0.10M	340.00	M2	700.35	238,119.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
3.00	ACONDICIONAMIENTO					612,376.31				100.00%	340.00	238,119.00	100.00%	340.00	238,119.00
3.10	CALLE HERMANA MIRABAL (Long=135.00m; Ancho Promedio=7.10m)														
3.11	LIMPIEZA CON EQUIPO (135.00x7.10x0.10)m	95.85	M3	150.00	14,377.50										
3.12	BOTE DE MATERIAL	115.02	M3E	325.00	37,381.50					100.00%	95.85	14,377.50	100.00%	95.85	14,377.50
3.13	SUMINISTRO DE MATERIAL (CALICHE) REGADO NIVELADO Y COMPACTADO (135.00x7.10x0.15)m	143.78	M3C	650.00	93,457.00					100.00%	115.02	37,381.50	100.00%	115.02	37,381.50
						145,216.00				100.00%	143.78	93,457.00	100.00%	143.78	93,457.00



MONTO PRESUPUESTADO	1,551,101.53
MONTO CUBICADO	1,392,572.72
% EJECUTADO	90%



Formulario No.332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General



AYUNTAMIENTO
**SANTO DOMINGO
NORTE**
Ciudad Ecoturística y Cultural

Clave Municipal No.

No. 019908
DIA MES AÑO

RNC: 425-00033-9

DO61BRRD00000000000330005219

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

019908 21411272713000330005219

Cap. No. Sub-Objeto Fondo Comprobante No. Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
<i>Carbta 503 a B</i> <i>ced. 001-0848541-8</i>			
DISTRIBUCION: Original Al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuatriplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería.			TOTAL

ANEXAR CERTIFICACION DE CONTRATO.

PREPARADOR	APROBADO POR
 GROS MARTINEZ DIAZ <i>07 JUN 2018</i> FIRMA	Lic. RAFAEL RODRIGUEZ MENDOZA.
REVISADO Unidad de Auditoría Interna	ENCARGADO DE LA UAI

Carbta



AYUNTAMIENTO
**SANTO DOMINGO
NORTE**
"Nuestro Norte eres tú"
RNC 425000339



DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE CUBICACION


PROYECTO: PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES UBICACION: EN EL SECTOR LUIS MANUEL CARABALLO II, SABANA PERDIDA SUR, SANTO DOMINGO NORTE.
NO. 2073

CONTRATISTA: ING. CARLITA SOSA FLORENTINO DE MAJON
PRIMERA CUBICACION

RNC: 001-0848541-3

FECHA: 27/08/2018

NO.	PRESUPUESTO DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL	%	PREVIO		%	ACTUAL		%	ACUMULADO	
								CANT.	VALOR		CANT.	VALOR		CANT.	VALOR
1.0	PRELIMINARES														
1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA DE 10*5' (TUBO NEGRO DE 2" CON PERFIL DE 1")	1.00	UND.	15,000.00	15,000.00					100.00%	1.00	15,000.00	100.00%	1.00	15,000.00
						15,000.00									
2.00	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES														
2.10	CALLE SAN ANTONIO (Long=34.72m)														
2.11	REPLANTEO DE CONTENES	169.56	ML	20.00	3,391.20					35.27%	59.80	1,196.00	35.27%	59.80	1,196.00
2.12	EXCAVACION DE CONTEN (169.56x0.50x0.20)	16.96	M3	345.46	5,859.00					35.26%	5.98	2,065.85	35.26%	5.98	2,065.85
2.13	EXCAVACION DE ACERA (169.56x1.00x0.10)	11.58	M3	345.46	4,000.43					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
2.14	BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	34.25	M3	325.00	11,131.25					20.93%	7.17	2,330.25	20.93%	7.17	2,330.25
2.15	TELFORD PARA CONTENES	16.96	M3	1,297.22	22,000.85					21.11%	3.58	4,644.05	21.11%	3.58	4,644.05
2.16	CONSTRUCCION DE CONTENES PULIDO FC=180KG/CM2 B=0.30m; H=0.50m	169.56	ML	820.25	139,081.59					35.27%	59.80	49,050.95	35.27%	59.80	49,050.95
2.17	RELLENO BAJO ACERA (115.78x1.00x0.10)	11.58	M3	650.00	7,525.52					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
2.18	CONSTRUCCION DE ACERAS FLOTADAS Y VIOLINADAS FC=210KG/CM2 E.O.10M	115.80	M2	700.35	81,100.53					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
						274,090.37									
2.20	CALLE SANTA ROSA (Long=56.00m)														
2.21	REPLANTEO DE CONTENES	112.00	ML	20.00	2,240.00					100.00%	112.00	2,240.00	100.00%	112.00	2,240.00
2.22	EXCAVACION DE CONTEN (112.00x0.50x0.20)	11.20	M3	345.46	3,869.15					100.00%	11.20	3,869.15	100.00%	11.20	3,869.15
2.23	BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	13.44	M3	325.00	4,368.00					100.00%	13.44	4,368.00	100.00%	13.44	4,368.00
2.24	TELFORD PARA CONTENES	5.60	M3	1,297.22	7,264.43					100.00%	5.60	7,264.43	100.00%	5.60	7,264.43
2.25	CONSTRUCCION DE CONTENES PULIDO FC=180KG/CM2 B=0.30M H=0.50M	112.00	ML	820.25	91,868.00					100.00%	112.00	91,868.00	100.00%	112.00	91,868.00
						109,609.58									

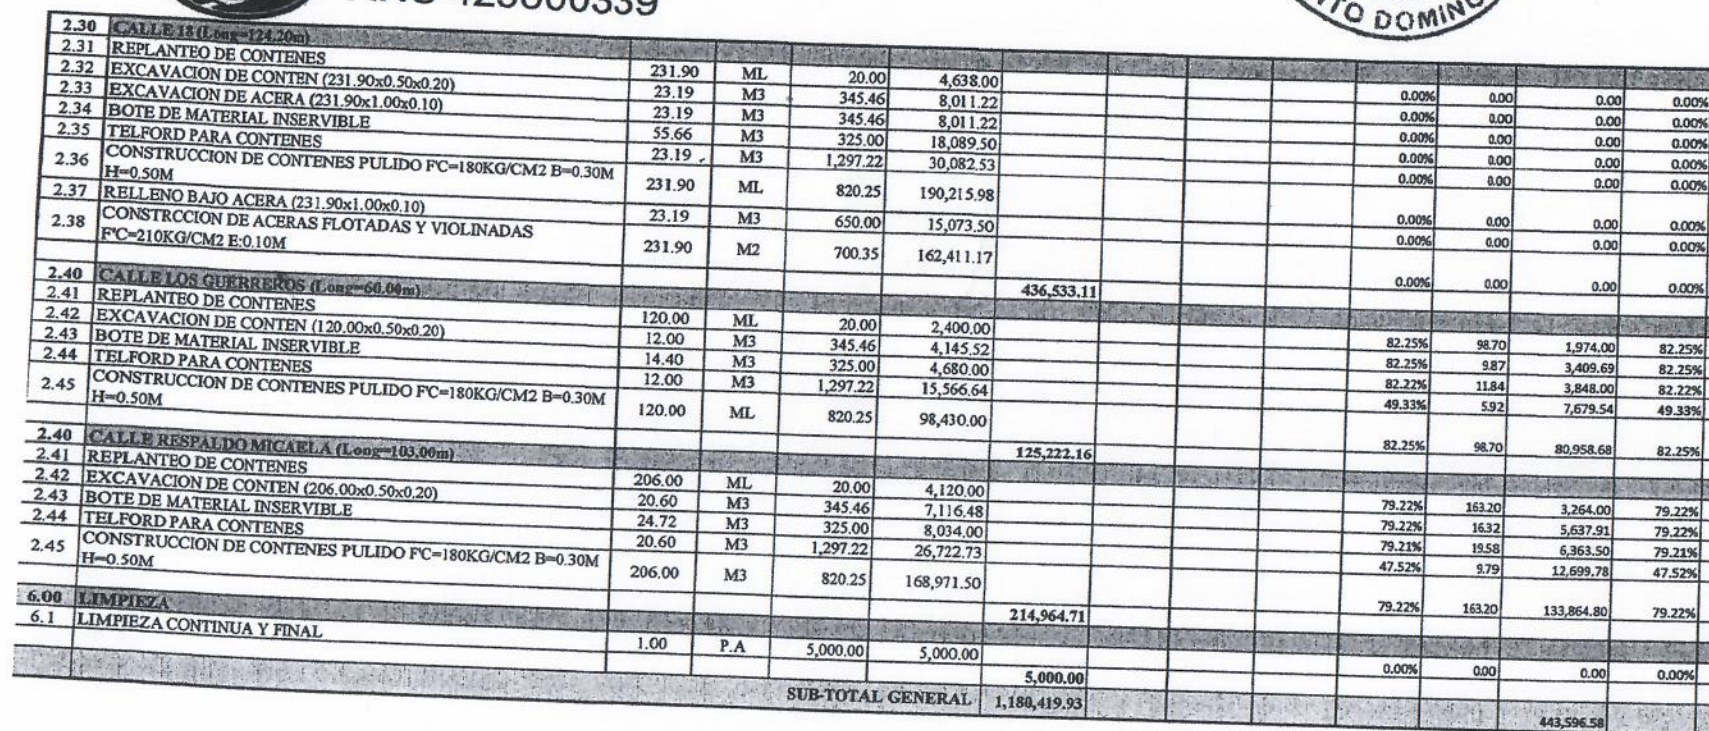



Auditor General



AYUNTAMIENTO
SANTO DOMINGO NORTE
Ciudad Evolutiva y Cultural

PROGRAMA INVERSION DE OBRAS

RNC: 425-00033-9

DO61BRD00000000000330005219

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RDS



FIRMA(S)

2019896# 21411272713:00130005219#

Cap. No.

Sub-Objeto

Fondo

Comprobante No.

Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

Lorenzo Rondon Arias
087-0013931-7

DISTRIBUCION: Original Al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;
Cuatriplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería.

TOTAL

EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

AL PAGO SOLICITADO.


Evaluated por: ARQ. ROSA MARYLIN SANCHEZ NIVAR

Fecha Evaluacion: 07/05/2017

Revisado por: LIC. RAFAEL RODRIGUEZ

Fecha Revision: 07/05/2017

Entregado a:
Fecha:



Carla



AYUNTAMIENTO
**SANTO DOMINGO
NORTE**
"Nuestro Norte eres tú"
RNC 425000339



DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE CUBICACION


PROYECTO: PARA LA CONSTRUCCION DE VARIOS POZOS CON BOMBA SUMERGIBLE UBICACION: EN EL SECTOR JUAN PABLO DUARTE, LOS GUARICANOS, SANTO DOMINGO NORTE.
NO. 2081

CONTRATISTA: ING. LORENZO RONDON ARIAS
PRIMERA CUBICACION

RNC: 087-0013931-7

FECHA: 30/07/2018

PRESUPUESTO							PREVIO			ACTUAL			ACUMULADO		
NO.	DESCRIPCION	CANT	UND	P.U.	VALOR	TOTAL	%	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.00	PRELIMINARES														
1.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA DE 10' X 5' (TUBO NEGRO DE 2 CON PERFIL DE 1)	1.00	UND	15,000.00	15,000.00					100.00%	1.00	15,000.00	100.00%	1.00	15,000.00
						RDS15,000.00									
2.00	CONSTRUCCION DE POZO SUMERGIDO EN EL CALLEJON CANDIDA TAPIA ESQ. CALLE 4TA. FRENTE MONJITAS														
A	TRABAJOS DE PLOMERIA														
2.01	PERFORACION DE POZO DE 6" Long=175.00Pie	1.00	P.A	33,000.00	33,000.00					100.00%	1.00	33,000.00	100.00%	1.00	33,000.00
2.02	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBO SDR41 DE 6"	9.00	UNID	3,400.00	30,600.00					88.89%	8.00	27,200.00	88.89%	8.00	27,200.00
2.03	BOMBA SUMERGIBLE 2HP	1.00	UD	32,465.41	32,465.41					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
2.04	MANGUERA DE POLIETILENO PN6	175.00	PIE	60.50	10,587.50					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
2.05	CABLE SOSTENDOR	175.00	PIE	23.94	4,188.77					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
2.06	CABEZAL DE POZO	1.00	UD	1,800.00	1,800.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
2.07	TANQUE PRESURIZADO de 60 gls	1.00	UD	11,500.00	11,500.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
3.00	ACCESORIOS PLOMERIA					124,141.68				0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
3.01	TUBOS DE 1 1/2" PVC PRESION	1.00	UNID.	650.00	650.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
3.02	LLAVE DE BOLA 1 1/2" ROSCADA	2.00	UNID.	800.00	1,600.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
3.03	TE "T" 1 1/2" PVC	2.00	UNID.	38.01	76.02					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
3.04	CODOS DE PVC 2X90	2.00	UNID.	95.00	190.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
3.05	CODOS DE PVC 2X45	2.00	UNID.	85.00	170.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
3.06	CODOS DE 1 1/2X45 PVC	2.00	UNID.	73.01	146.02					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
3.07	CHEQUE DE 2 HORIZONTAL	1.00	UNID.	850.00	850.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
3.08	ADAPTADOR TIPO CODO 90	1.00	UNID.	170.00	170.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
3.09	CLIC ALAMBRE SUJETADOR BOMBA	4.00	UNID.	4.00	16.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
3.10	NIPLE ACERO 1 1/2 X4	1.00	UNID.	150.00	150.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
3.11	M.O PLOMERIA	1.00	P.A	12,000.00	12,000.00					0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
						16,018.04				0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00





DIRECTOR GRAL. DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Ave. Hermanas Mirabal, Esq. Gral. Modesto Díaz, Urb. Máximo Gómez, Sto. Dgo. Norte, R. D. • Tel.: 809-331-7171

George G.

Formulario No.332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General



AYUNTAMIENTO
**SANTO DOMINGO
NORTE**
Ciudad Ecoturística y Cultural

Clave Municipal No.

COMPROBANTE NO.: 4571

RNC: 425-00033-9

DO61BRRD00000000000330005219

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

No. 0199

DIA MES AÑO

05 06 2018



RD\$

310,218.18

PE.
MONEDA DE CURSO L

FIRMA(S)

00199000 2141127271300130005219

Cap. No.

Sub-Objeto

Fondo

Comprobante No.

Fecha

Unidad Organizativa

Valor

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

PAGO POR CONCEPTO DE PAGAR DEL FONDO DE INVERSIÓN DEL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NORTE, PARA EL PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR DEL SECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS, SEGUN ANEXOS.

Cristina Ferrand De Paula
001-1518303-0
12/6/18

TOTAL

DISTRIBUCION: Original Al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuatuplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería.

Total General RD\$

310,218.18

Retenciones

%

Monto Neto a Pagar RD\$

310,218.18




RAUL ALEJANDRO TIBURCIO GUERR
ENC/CONTABILIDAD

JOSE ANTOLIN POLANCO ROSA

Regidor/a

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)



JUAN RAFAEL VENTURA MATOS

ERASMO ROSARIO ROSARIO

RENO VIDAL



Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

1. Original 2. Duplicado 3. Triplicado 4. Cuatuplicado 5. Quintuplicado

1. 01/06/18



AYUNTAMIENTO
**SANTO DOMINGO
NORTE**
"Nuestro Norte eres tú"
RNC 425000339



DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE CUBICACION

PROYECTO: PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS CALLES NO. 2085 UBICACION: EN EL SECTOR RINCÓN DE HIGUERO, HIGUERO, ZONA RURAL, LOS GUARICANOS, SANTO DOMINGO NORTE, ENTRANDO POR LA CINCUNVALACION.
CONTRATISTA: CRISTINA ROSAMEL FERRAND DE PAULA
PRIMERA CUBICACION RNC:001-1518303-0

PRESUPUESTO DETALLE		FECHA: 24/07/2018													
NO.		CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL	PREVIO			ACTUAL			ACUMULADO		
1.0	PRELIMINARES						%	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.1	SUM E INST DE VALLA INFORMATIVA DE 10"5' (TUBO NEGRO DE 2" CON PERFIL DE 1")	1.00	UNID	15,000.00	15,000.00	15,000.00				100.00%	1.00	15,000.00	100.00%	1.00	15,000.00
2.00	ACONDICIONAMIENTO														
3.10	CALLE PRINCIPAL DE LOS GUANTE (Long=781.90m; Ancho Promedio=5.20m)														
3.11	LIMPIEZA CON EQUIPO (667.6X6.00X0.1)m	406.56	M3	150.00	60,984.00	60,984.00									
3.12	BOTE DE MATERIAL	487.89	M3E	325.00	158,565.36	158,565.36				100.00%	406.56	60,984.00	100.00%	406.56	60,984.00
3.13	SUMINISTRO DE MATERIAL (TOSCA) REGADO NIVELADO Y COMPACTADO (677.6X6.00X0.15)m	609.84	M3C	1,537.92	937,885.13	937,885.13				100.00%	487.89	158,564.25	100.00%	487.89	158,564.25
4.00	LIMPIEZA														
4.1	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	P.A.	8,000.00	8,000.00	8,000.00				92.65%	565.00	868,924.80	92.65%	565.00	868,924.80
										0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
	GASTOS INDIRECTOS														
1.	SEGUROS Y FIANZAS														
2.	GASTOS ADM														
3.	TRANSPORTE		4.00%			47,217.18						1,103,473.05			1,103,473.05
4.	BENEFICIOS		1%			35,411.03						44,138.92			44,138.92
5.	SUPERVISION		2.50%			29,510.86						33,104.19			33,104.19
6.	LEY 686		10%			118,043.45						27,586.83			27,586.83
7.	CODIA		4%			47,217.38						110,347.31			110,347.31
8.	IMPREVISTO		1%			11,804.34						44,138.92			44,138.92
9.	ITBIS (DE LA DIRECCION TECNICA)		0.1%			1,180.43						11,034.73			11,034.73
			5.0%			59,021.72						1,103.47			1,103.47
			18.0%			21,247.82						19,862.51			19,862.51
	SUB-TOTAL INDIRECTOS					370,656.43						291,316.89			291,316.89
	TOTAL GENERAL					1,551,090.93									

