

OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO


Informe Niveles, Avances de Obras (Abril-Junio 2023)

OBRAS PROGRAMADAS PARA EJECUCION	PRESUPUESTO		AVANCES			OBSERVACIONES
	Estimado	Ejecutado	50 %	85 %	100 %	
Acondicionamiento de la Capilla Comunitaria, Arroyo Seco	50,000	56,210.00	-	-	✓	Terminada
Materiales de Contruccion, acondicionamiento del puente Comajon, Los Robles	50,000	60,535.25	-	-	✓	Terminada
Construcción Contenes y badenes de la calle principal del sector , Urb. Julian Javier II	56,000	61,216.00	-	-	✓	Terminada
Colocación de lámparas Led y Sillas Plásticas para el Centro Comunitario, Corozal Abajo	45000	34,515.00	-	✓		En Ejecucion
Colocación de Lámparas Led para el alumbrado publico Tramo inicial, Los Pomos	49000	39,899.95	-	✓		En Ejecucion

a) Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo Municipal Tenares (Primer Trimestre 2023).


Estado de situación obras PPM-2023	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas y entregadas	5	21%
Obras en proceso de ejecucion	5	21%
Obras pendientes de ejecucion	14	58%
TOTAL	24	100%

Análisis de Ejecución

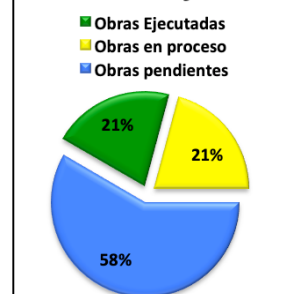

b) Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo Municipal Tenares (Primer Trimestre 2023).

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
RD\$ 1,550,000.00	RD\$ 252,376.20	RD\$ 1,297,623.80	% 16

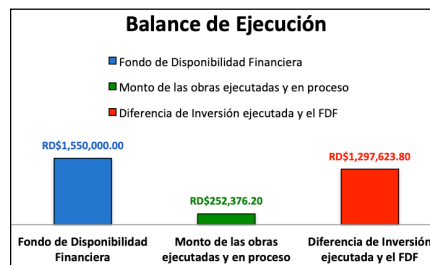

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ ROSA
Encargado de Planeamiento Urbano

