



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES**  
**DEPTO. DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS**  
**AÑO DE LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO SOE**

**INFORME DE EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PPM-MSDE, JUNIO-DICIEMBRE 2019**



ITEM	No. PRSUP	DESCRIPCION	CONTRATISTA	MONTOS RD\$			PORCENTAJE %			STATUS	OBSERVACION
				CONTRATADO	AVANCE	CUBRICACION PAGADA	CUBRICACION PENDIENTE	EJEC. REAL	DE PAGO		
1	PP 001/2019	ASFALTADO DE CALLES(J.V. RESPALDO ALMA ROSA)RESPALDO ALMA ROSA	ING. RITA MARGARITA MARTINEZ RIOS	1,923,652.15	384,730.43	Avance	1,211,515.33	85.00%	20.00%	Finalizada	Falta cub. De cierre
2	PP 002/2019	REPARACION DE PARQUE GREGORIO LUPERON(J.V. EL TRIANGULO), ALMA ROSA II	INMAPRO GROUP INVESTMENT, SRL	2,158,681.88						Licitada	Avance en proceso
3	PP 003/2019	ASFALTADO DE CALLES(J.V.URBANIZACION MARGARITA) URB. MARGARITA	ING. YSAMIAS CABRERA HERNANDEZ	2,681,882.55	536,376.51	Avance	1,107,833.87	85.00%	20.00%	Finalizada	Falta cub. De cierre
4	PP 004/2019	CONSTRUCCION DE OFICINA(CLUB LOS TRINITARIOS), SECTOR LOS TRINITARIOS	INVERSIONES ROARAR, SRL	1,842,884.14	368,576.83	Avance		15.00%	20.00%	En ejecución	Esperan el permiso del ISSFEA para trabajar dentro del Club.
5	PP 005/2019	ASFALTADO Y BACHEO DE CALLES(J.V.MARIA MERCEDES), RES. MARIA MERCEDES, VILLA FARO	ARQ. ISAMELY CABRERA BELLO	2,641,871.11	528,374.22	Avance	1,059,364.73	80.00%	20.00%	Finalizada	Falta cub. De cierre
6	PP 006/2019	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y BACHEO DE CALLES, (OCBS CLUB VILLA FARO), VILLA FARO	BLASSOLAR, EIRL	2,758,464.61	551,692.92	Avance	991,949.59	55.00%	20.00%	En ejecución	Se proceso 1ra cub.
7	PP 007/2019	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (OCBS ASOCIACION PRO DESARROLLO), MENDOZA I	ING. CARLOS FRANCISCO LUNA ALMONTE	2,696,418.56	539,283.71	Avance		20.00%	20.00%	En ejecución	Se trabajo en los filtrantes
8	PP 008/2019	TERMINACION DE SALON MULTITUOSOS (J.V. PARQUE DEL ESTE I), PARROQUIA DIVINO NIÑO DE JESUS, RES. PARQUE DEL ESTE	FELICIA HEREDIA MARTINEZ	3,112,011.93	622,402.39	Avance		15.00%	20.00%	En ejecución	Trabajan con la electricidad y el impermeabilizante
9	PP 009/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. FRANCISCO HURTADO), BO. MAQUITERIA,	ING. DOMINGO ANTONIO POLANCO PERA	2,283,534.07	456,706.81	Avance	955,597.41	50.00%	20.00%	En ejecución	Espera pago de la 1ra cub.
10	PP 010/2019	ASFALTADO DE CALLES (J.V. LA VICTORIA VILLA DUARTE) LOS PINOS LA VICTORIA, VILLA DUARTE	JCI SOLUTIONS, SRL	2,393,434.66	478,686.93	Avance			20.00%	No iniciada	Van a iniciar los trabajos el 13/12/2019
11	PP 011/2019	CONSTRUCCION DE PLAY (J.V. RESIDENCIAL LOS TRES OJOS) RES. LOS TRES OJOS	COSMO CARIBE SRL	4,517,995.07	903,599.01	Avance	829,976.92	35.00%	20.00%	En ejecución	Espera pago de la 1ra cub.
12	PP 012/2019	ASFALTADO DE CALLES(ORG. FUNDACION PRO-DESARROLLO COMUNAL DOMINICANA) LOS MAMEYES	BIO ARQUITECTURA DE EXTERIORES, SRL	1,810,496.42	362,099.28	Avance	962,831.28	100.00%	20.00%	Finalizada	Falta cub. De cierre
13	PP 013/2019	RECONSTRUCCION DE CALLEONES (OCB GRUPO JUVENIL NUEVA ESPERANZA) RIVERA DEL OZAMA,	SERVICIOS DE INGENIERIA VEGSA, SRL	2,446,362.61	489,272.52	Avance	630,063.87	45.00%	20.00%	En ejecución	Espera pago de la 1ra cub.
14	PP 014/2019	SOLUCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. COMUNIDAD UNIDA SAN ANTONIO), LOS MINAS	SANTANA MARTINEZ Y ASOCIADOS, S.A.	2,592,957.21	518,591.44	Avance		20.00%	20.00%	En ejecución	Validaron los contenidos y empezaron las aceras



**ASIDE**  
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES**  
**DEPTO. DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS**  
**AÑO DE LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO SDE**

**INFORME DE EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PPM-MSDE, JUNIO-DICIEMBRE 2019**

ITEM	No. PRESUP	DESCRIPCION	CONTRATISTA	MONTO			CUBICACION			PORCENTAJE %		STATUS	OBSERVACION
				CONTRATADO	AVANCE	MONTOS ROS	PAGADA	PENDIENTE	EJEC. REAL	DE PAGO			
15	PP 015/2019	REPARACION DE CANCHA;V. UNIDOS POR EL PROGRESO) BO. JUAN PABLO II	SANTANA MARTINEZ Y ASOCIADOS, S.A.	2,666,693.91	533,338.78	Avance				35.00%	20.00%	En ejecución	Se evaluara para fines de cerrar el presupuesto
16	PP 016/2019	ASFALTADO DE CALLE (I.V. DON OSCAR) RES. DON OSCAR	PROYECTOS OMI, SRL	2,507,593.10	501,518.62	Avance				100.00%	20.00%	Finalizada	Espera pago de la 1ra cub. Y se va a procesar cub. De cierre
17	PP 017/2019	CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES (I.V. ALTOS DEL CACHON),ALTOS DEL CACHON	ING. FELIPE ELEUTERIO VIDAL MORENO	2,522,295.54	504,459.11	Avance				35.00%	20.00%	En ejecución	Espera pago de la 1ra cub.
18	PP 018/2019	ALUMBRADO PUBLICO (I.V. CABIRMA DEL ESTE) CABIRMA DEL ESTE)	ING. MANUEL BAEZ SANTOS	1,735,147.78	347,029.56	Avance				60.00%	20.00%	En ejecución	Espera pago de la 1ra cub.
19	PP 019/2019	ASFALTADO DE CALLES,(OCB MADRE CANDIDA), BO. LA ISLA, LOS MINA SUR.	BLASSOLAR, EIRL	2,207,788.00	441,557.60	Avance				100.00%	20.00%	Finalizada	Falta cub. De cierre
20	PP 020/2019	RECONSTRUCCION DE CALLEJONES (I.V. LA ISLA EN COSECHA), BO. LA ISLA, LOS MINA SUR	GRUPO CABIOCA, SRL	1,867,937.58	373,587.52	Avance					20.00%	En ejecución	
21	PP 021/2019	ASFALTADO DE CALLES (OCB CLUB BENJAMIN) LA ISLA ABAJO	KANAQA INGENIERIA Y DISEÑO, SRL	2,253,743.12	450,748.62	Avance				100.00%	20.00%	Finalizada	Falta cub. De cierre
22	PP 022/2019	ACERAS Y CONTENES (I.V. LAURA MARTEL), RES. LAURA MARTEL, SECTOR LA UREÑA	ING. ALFONSO BIDO SANTANA	2,370,936.25	474,187.25	Avance				35.00%	20.00%	En ejecución	Espera pago de la 1ra cub.
23	PP 023/2019	REPARACION DE PLAY(I.V. NUEVA ESPERANZA), LOS FRAILES II	ZOOGONCO CONSTRUCCIONES CIVILES, SRL	2,522,312.26	504,462.45	Avance				45.00%	20.00%	En ejecución	Espera pago de la 1ra cub.
24	PP 024/2019	ASFALTADO DE CALLES (I.V. CORALES DEL SUR) CORALES DEL SUR	INMAPRO GROUP INVESTMENT, SRL	2,315,520.20	463,104.04	Avance				100.00%	20.00%	Finalizada	Espera pago de la 1ra cub. Se va a procesar cub. De cierre
25	PP 025/2019	ASFALTADO DE CALLES (ORG. UNION Y PROGRESO) AGUAS LOCAS	KANAQA INGENIERIA Y DISEÑO, SRL	2,317,441.56	463,488.31	Avance					20.00%	No iniciada	Van a iniciar los trabajos el 11/12/2019
26	PP 026/2019	ASFALTADO DE CALLES (ORG. J.V. LA LUZ DEL MUNDO) AGUAS LOCAS	JCI SOLUTIONS, SRL	2,351,779.25	470,355.85	Avance					20.00%	No iniciada	Van a iniciar los trabajos el 11/12/2019



**ASIDE**  
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE**  
**DIRECCION GENERAL DE SUPERVISIZION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES**  
**DEPTO. DE FISCALIZACION Y EVALUACION DE OBRAS**  
**AÑO DE LA INTEGRACION COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO SDE**

**INFORME DE EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PPM-MSDE, JUNIO-DICIEMBRE 2019**

9 de diciembre de 2019

ITEM	No. PRSUP	DESCRIPCION	CONTRATISTA	MONTOS RD\$			PORCENTAJE %		STATUS	OBSERVACION		
				CONTRATADO	AVANCE	CUBICACION PAGADA	EJEC. REAL	DE PAGO				
27	PP 077/2019	ASFALTADO DE CALLES (I.V. FRENTE DE MUJERES JUAN PABLO DUARTE), LOS FRALTES I	CONSTRUCCIONES ISAYALY, SRL	2,492,242.49	498,448.50	Avance	1ra. Cub.	1,116,906.45	100.00%	20.00%	Finalizada	Espera pago de la 1ra cub. Se va a procesar cub. De cierre
28	PP 028/2019	ASFALTADO DE CALLES (I.V. RADIANTE AMANEGER) AUTOPISTA DE SAN ISIDRO	ARQ. ISAMELY CABRERA BELLO	2,610,002.74	522,000.55	Avance	1ra. Cub.	1,404,870.54	100.00%	20.00%	Finalizada	Finalizaron los trabajos. Falta procesar cub. Final
29	PP 029/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y ROTULACION DE CALLES (I.V. LOS FUNDADORES), INVI DOREX	GEOCONSATRUCCIONES, SRL	2,076,626.02	415,325.20	Avance				20.00%	No iniciada	Tiene avance
30	PP 030/2019	ASFALTADO DE CALLES ( NUEVO AMANEGER) , LA GRUA	PROYECTOS OMIC, SRL	2,447,895.92	489,579.18	Avance			10.00%	20.00%	En ejecución	Iniciaron los trabajos
31	PP 031/2019	RECONSTRUCCION DE PLAY (LUGA DEPORTIVA BRISAS DEL ESTE),BRISAS DEL ESTE	ING. KETTY VICTORIA RAMIREZ DE ESTEVEZ	3,885,487.83	777,097.57	Avance			25.00%	20.00%	En ejecución	Se estan realizando reuniones con los comunitarios para replantear el area de juego
32	PP 032/2019	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (I.V. CIUDAD DEL ALMIRANTE), EL ALMIRANTE	ING. KETTY VICTORIA RAMIREZ DE ESTEVEZ	3,499,494.81	699,898.96	Avance	1ra. Cub.	2,344,149.62	100.00%	20.00%	Finalizada	Espera pago de la 1ra cub. Se va a procesar cub. De cierre
33	PP 033/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENE (LA NUEVA ESPERANZA) EL ALMIRANTE	GRUPO CABLOCA, SRL	2,627,721.82	525,544.36	Avance	1ra. Cub.	579,554.81	45.00%	20.00%	En ejecución	Espera pago de la 1ra cub.
34	PP 034/2019	RECONSTRUCCION D VERJA PERIMETRAL(FUNDACION PADRE CLEMENTE), VILLA CARMEN	JAM CONSTRUCCIONES, SRL	3,377,018.98	675,403.80	Avance	1ra. Cub.	508,637.88	32.00%	20.00%	En ejecución	Espera pago de la 1ra cub.
35	PP 035/2019	ALUMBRADO PUBLICO (I.V. NUEVA ALMANZA)INVIVENDA	SERVICIOS DE INGENIERIA VESSA, SRL	1,631,827.79	326,365.56	Avance	1ra. Cub.	552,984.62	35.00%	20.00%	En ejecución	Espera pago de la 1ra cub.
36	PP 036/2019	ASFALTADO DE CALLES ( I.V. VILLA ESPERANZA) , INVIVENDA	CONSTRUCCIONES ISAYALY, SRL	2,544,963.78	508,992.76	Avance			13.00%	20.00%	En ejecución	Trabajo con dos tramos de calle (encalichado)
37	PP 037/2019	ASFALTADO DE CALLES Y VIVIENDAS( JESUS LA LUZ DEL MUNDO), SOLARES DEL PERLA	ING. YSALAS CABRERA HERMANDEZ	2,698,287.82	539,657.56	Avance	1ra. Cub.	1,696,439.13	100.00%	20.00%	Finalizada	Finalizo, se le proceso 1ra cub. Y luego la de cierre
38	PP 153/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (I.V. RAMON MATIAS MELLA), SECTOR RAMON MATIAS MELLA		2,386,213.29							Licitada	



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE**  
**DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES**  
**DEPTO. DE FISCALIZACION Y EVALUACION DE OBRAS**  
**AÑO DE LA INTEGRACION COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO SDE**

**INFORME DE EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PPM-MSDE, JUNIO-DICIEMBRE 2019**

9 de diciembre de 2019

ITEM	No. PRSUP	DESCRIPCION	CONTRATISTA	MONTOS RD\$				PORCENTAJE %		STATUS	OBSERVACION
				CONTRATADO	AVANCE	CUBICACION PAGADA	CUBICACION PENDIENTE	EJEC. REAL	DE PAGO		
39	PP 154/2019	REPARACION DE CANCHA (I.V. MI SUEÑO II), URB. MI SUEÑO II		1,692,479.24						Licitada	
40	PP 155/2019	REPARACION DE MULTUSOS, (I.V. BELLO CAMPO), BELLO CAMPO		1,763,123.09						Licitada	
41	PP 156/2019	ALUMBRADO PUBLICO, (I.V. LOS ALPES I), LOS ALPES I		1,085,017.97						Licitada	
42	PP 157/2019	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (I.V. MARLIN), URB. MARLIN		2,716,583.46						Licitada	
43	PP 158/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (OCBS COMITE SOCIAL COMUNITARIA), BO. PUEBLO NUEVO, VILLA DUARTE		2,576,999.02						Licitada	
44	PP 159/2019	REPARACION DE MULTUSOS, (I.V. EDUARDO BRITO), MANZANA H, LOS MAMEYES		1,445,200.48						Licitada	
45	PP 160/2019	RECONSTRUCCION DE CALLEONES (I.V. LA HUMANITARIA), ENS. ISABELITA		2,120,573.32						Licitada	
46	PP 161/2019	CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CANADA, (OCB MOVIMIENTO SOCIAL COMUNITARIO) RIVIERA DEL OZAMA		2,912,564.14						Licitada	
47	PP 162/2019	RECONSTRUCCION DE CALLEONES (I.V. NUEVA ESPERANZA II) RIVIERA DEL OZAMA		2,117,893.29						Licitada	
48	PP 163/2019	SANEAMIENTO DE CANADA, (I.V. RIVIERA DEL OZAMA), RIVIERA DEL OZAMA		2,301,050.13						Licitada	
49	PP 164/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (I.V. SAN VICENTE DE PAULI), SAN VICENTE DE PAULI		2,732,807.97						Licitada	



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES**  
**DEPTO. DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS**  
**AÑO DE LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO SDE**

**INFORME DE EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PPM-MSDE, JUNIO-DICIEMBRE 2019**

9 de diciembre de 2019

ITEM	No. PRSUP	DESCRIPCION	CONTRATISTA	MONTOS RDS			PORCENTAJE %		STATUS	OBSERVACION
				MONTO CONTRATADO	AVANCE	CUBRICACION PAGADA	CUBRICACION PENDIENTE	ELEC. REAL		
50	PP 165/2019	CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR LOS MINA, KATANGA AL FINAL DE TRINIA DE MOYA		2,516,376.22					Licitada	
51	PP 166/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. VISTA HERMOSA), VISTA HERMOSA		2,514,749.00					Licitada	
52	PP 167/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. DONDE FUE TINIBLA), NUEVO AMANECER		2,562,288.74					Licitada	
53	PP 168/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. UNIDOS POR EL PROGRESO), NUEVO AMANECER		2,617,153.43					Licitada	
54	PP 169/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. BRISAS DE LAS AMERICAS), LA URENA		2,465,904.96					Licitada	
55	PP 170/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (UNION Y SACRIFICIO), FRALLES II		2,497,132.51					Licitada	
56	PP 171/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. NUEVA ESPERANZA), FRALLES II		2,566,517.81					Licitada	
57	PP 172/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, BACHEO Y ROTULACION DE CALLES (J.V. UNION Y PAZ), FRALLES II		2,523,945.57					Licitada	
58	PP 173/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LOS TRUNFADORES), AUTOPISTA DE SAN ISIDRO		2,547,950.23					Licitada	
59	PP 174/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (OCBS ASOCIACION COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER) BO. LA ORQUIDEA, CIUDAD		2,484,385.80					Licitada	
60	PP 175/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (MUJERES UNIDAS), SAN MIGUEL DE MENDOZA		2,497,953.59					Licitada	



**ASIDE**  
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE**  
**DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES**  
**DEPTO. DE FISCALIZACION Y EVALUACION DE OBRAS**  
**AÑO DE LA INTEGRACION COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO SDE**

**INFORME DE EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PPM-MSDE, JUNIO-DICIEMBRE 2019**

9 de diciembre de 2019

ITEM	No. PRSUP	DESCRIPCION	CONTRATISTA	MONTOS RD\$			PORCENTAJE %		STATUS	OBSERVACION	
				MONTO CONTRATADO	AVANCE	CUBICACION PAGADA	CUBICACION PENDIENTE	EJEC. REAL			DE PAGO
61	PP 176/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (HERMANAS MIRABAL, MENDOZA								Licitada	
62	PP 177/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (DESARROLLO COMUNITARIO DE MUJERES LAS FLORES II), BRISAS DEL ESTE								Licitada	
63	PP 178/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (I.V. LOS LAURELES), BOL LOS LAURELES, BRISAS DEL ESTE								Licitada	
64	PP 179/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (I.V. LAS ENFERMERAS), EL ALMIRANTE								Licitada	
65	PP 180/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (OCB YAHAIRA), CARRETERA MELLA KM 15								Licitada	
66	PP 181/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (I.V. 24 SEPTIEMBRE), RESP. VILLA CARMEN								Licitada	
67	PP 182/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (I.V. MARGARA I), TAMARINDO								Licitada	
68	PP 183/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (I.V. RIVIERA DEL OZAMA), CANCINO ADEINTRO								Licitada	
69	PP 184/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, (OCB MUJERES COMPROMETIDAS POR EL DESARROLLO), SECTOR TAMARINDO								Licitada	
70	PP 185/2019	ALUMBRADO PUBLICO (I.V. LA GRAN UNION), BO. INV1, LOS MINA								Licitada	
71	PP 186/2019	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (I.V. FE Y CARIDAD) BRISAS DEL ESTE								Licitada	



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE**  
**DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES**  
**DEPTO. DE FISCALIZACION Y EVALUACION DE OBRAS**  
**AÑO DE LA INTEGRACION COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO SDE**

**INFORME DE EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PPM-MSDE, JUNIO-DICIEMBRE 2019**

ITEM	No. PRESUP	DESCRIPCION	CONTRATISTA	MONTOS RD\$				PORCENTAJE %		STATUS	OBSERVACION
				MONTO CONTRATADO	AVANCE	CUBIGACION PAGADA	CUBIGACION PENDIENTE	EJEC. REAL	DE PAGO		
72	PP 187/2019	RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y ASFALTADO DE CALLES (MOV. DE MUJERES PARA LA COMUNIDAD), MENDOZA		2,350,908.91						Licitada	
Preparado por la Division de Cubicaciones				176,442,956.02	18,246,544.73						
											22,303,937.72



*13/12/19*  
 FECHA






**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES**  
**DEPTO. DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS**  
**AÑO DE LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO SDE**

**INFORME DE EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PPM-MSDE, JUNIO-DICIEMBRE 2019**


9 de diciembre de 2019

ITEM	No. PRSUP	DESCRIPCION	CONTRATISTA	MONTO		AVANCE	CUBICACION PAGADA	CUBICACION PENDIENTE	PORCENTAJE %		STATUS	OBSERVACION
				CONTRATADO	RDS				EJC. REAL	DE PAGO		

1.- ESTADO DE SITUACION GENERAL DE LAS OBRAS		
Estado	Cantidad	Porcentaje %
Obras Licitadas	72	100.00%
Para licitar	0	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>72</b>	<b>100.00%</b>

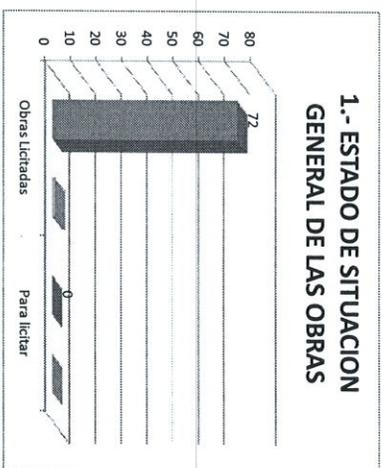

1.1 SITUACION DE LAS OBRAS LICITADAS		
Estado	Columna1 Cantidad	Columna2 Porcentaje %
Ejecución	20	27.78%
Finalizadas	12	16.67%
No Iniciadas	4	5.56%
Avance en proceso	36	50.00%
<b>TOTAL</b>	<b>72</b>	<b>100.00%</b>

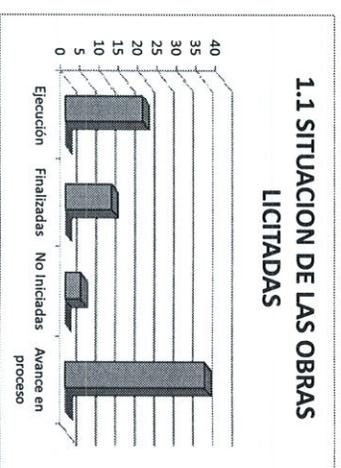

*[Handwritten signature]*
