

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de La Vega

TESORERÍA

Cta. Programa de Inversión

RNC: 4-03-00029-1

Ayuntamiento del Municipio de La Vega

DO11BRRC00000000000502032030

PACLESE CONTRA ESTE

LUIS ALBERTO GILBERT

CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

925211

SEPTIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 11/100

PESOS

ALONDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAIS:

#018963# 011117272713400502012010#

112

2022/11/10

CUENTA A CARGARSE

Programática

Clasificador de Gasto

Source:
Jurnal

Actividad Interna

Denominación

Va'or BDB


DISTRIBUCIÓN: Original, al interesado: Cámara de Cuentas, Contraloría, Tesorería, y S indicatura

TOTAL \$2\$

CARGO

CEDULA

FIRMA



အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဗင်္ဂလားပင်လယ်၊ ကော့ကော့

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de La Vega

TESSORERIA

Cta. Programa de inversión

Ayuntamiento del Municipio de La Vega

RNC: 4-03-18029-1

DOI:10.1890/0006-022X(2003)203[2030]

No.

016586

D: A

Yes

225

PAGUESE CONTRA ESTE

CHEQUE A LA ORDEN DE:

THE ALLOCATION OF RESOURCES

RD\$

140

ATTENTIVE NOVITIA 7 YEARS AID. PRESIDENT CONSTITUTION 7 DAYS 60H 11:10.

PESON

MAY 17 1955

BankReservas

FIRMAS'

[illegible]

12

Details

CUENTA A CARGARSE

Programática

Clasificador del Gasto

Fuerst
Fisch.

107

Denominación

Valor RDS

DISTRIBUCIÓN: Original, al interesado: Cámara de Cuentas, Contraloría, Tesorería y Sindicatura

TOTAL FDS

CARGO

CEDULA

F.R.M.A.

PO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
 LASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: Tiene Factura: ☐
 ODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA  Orden Compra 0
 BENEFICIARIO LUIS ALBERTO GIL JIMENEZ
 DIRECCION TELEFONO
 TA. BANCARIA 050-203203-0 Inversion Obras Municipales

Detalle
 AGO DE CUBICACION NO.01 POR LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION REALIZADOS DE LA IGLESIA LOS
 ALERIOS DE ESTA CIUDAD DE LA VEGA, SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.
 *SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 11/100 PESOS (RD\$793,352.11).***
 CALCULO RETENCIONES: retencion del 5% de ley=843,991.61x5%=42,199.58 ; 1% DE FONDO DE
 ENSIONES=843,991.61x1%=8,439.92 ;]

Estructura ogramática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
1.07.0053	2.7.01.2.01	2.2	30	9998	102	0	4305	Obras para edificación no residencial	843,991.61



Presidente Concejo Municipal
 o debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Total General RDS	843,991.61
Retenciones	
retencion del 5% de ley	42,199.58
1% DE FONDO DE PENSIONES	8,439.92
Total Retenciones	50,639.50

da Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 da Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 tribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
 erto

Monto Neto a Pagar RD\$ 793,352.11



ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE
LA VEGA

Al : Lic. Hipócrates Gil
Tesorero Municipal

Vía : Lic. Lucia Mieses Acosta
Enc. De Contabilidad

Fecha : 11 de Mayo del 2022

Asunto : Solicitud de Pago.

Distinguidos Licenciados:

Muy cortésmente, tengo a bien solicitarle el pago de **RD\$843,991.61 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON 61/100)**, a favor del señor **LUIS ALBERTO GIL JIMENEZ**, portador de la cédula de identidad No. **74-00000000000000000000**, por concepto de pago de cubicación No. 1, en los trabajos de Reconstrucción de la Iglesia Los Valerios, de esta ciudad de La Vega, según expediente anexo.

Ing. Kelvin Cruz
Alcalde Municipio La Vega

Palacio Municipal: C/ Don Antonio Guzmán esq. Prof. Juan Bosch, La Vega, República Dominicana

Tel: (809) 242-2000 WebSite: lavega.gob.do

@alcaldelavegana_oficial [alcaldelaveganaoficial](https://www.facebook.com/alcaldelaveganaoficial)



Ayuntamiento del Municipio de La Vega

Ciudad Cultura, Olímpica y Caribolaesca

Al : Ing. Kelvin Cruz.
Alcalde Municipal

Vía : Lcda. Aura Gil
Directora Administrativa

Fecha : 09 de Mayo 2022

Asunto : Solicitud de Pago

Distinguidos Licenciados:

Muy cortésmente, tengo a bien solicitarle el pago al sr: **LUIS ALBERTO GIL JIMENEZ**. Por el monto de **RD\$843,991.61**, (Ochocientos Cuarenta y Tres Mil Novecientos Noventa y un Pesos 61/100), por pago cubicación No. 1, en los trabajos de Reconstrucción Iglesia los Valerios, la Vega de esta Ciudad.

Nombres	Cedula	Cargo	Monto
LUIS ALBERTO GIL JIMENEZ		Ing. De obra	RD\$,843,991.61

Anexo:

- Contrato.
- Cubicación No. 1
- Certificación


Arq. Yakira Paola De Moya
Director Dirección Técnica

Palacio Municipal, C/ Don Antonio Guzmán esq. Prof. Juan Bosch, La Vega, República Dominicana
Tels: (809) 242-2000 / 573-2351/573-2811 / Fax: (809) 573-8544
E-mail: ayuntamientolavega@hotmail.com.ar



Sistema de Análisis de Costos y Presupuestos.
Oficina de Obras y Dirección Técnica.

PROYECTO: RECONSTRUCCION IGLESIA LOS VALERIOS, La Vega.

UBICACION: Los Valerios, La Vega.

SUB-CONTRATISTA: Luis Alberto Gil Jimenez

CUBICACION: No.01

CEDULA:

OCUPACIÓN: Ing. Civil

FECHA DE INICIO: 17 de Febrero 2022

FECHA DE CUBICACIÓN: 9 de Mayo 2022

#	DETALLE DE PARTIDAS	CANT	UD	PRECIO RD\$	SUBTOTAL RD\$	TOTAL RD\$
1	Limpieza de Area	1.00	P.A	15,000.00	15,000.00	
2	Corte Arbustos Varios	1.00	P.A	90,000.00	90,000.00	
3	Demolicion Muros	1.00	P.A	95,000.00	95,000.00	
4	Replanteo Construcción	1.00	P.A	10,000.00	10,000.00	
5	Exc. Zapata de Muro	8.75	Mt3	357.61	3,129.09	
6	Exc. Zapata de Columnas	12.50	Mt3	390.00	4,875.00	
7	Relleno Compacto en Obra	45.00	Mt3	524.40	23,598.00	
8	Bote de Material Inservible	18.00	Mt3	400.00	7,200.00	
9	Chapapote	26.50	Mt3	7,754.73	205,500.35	
10	Horm. Zapata Columnas	6.54	Mt3	7,790.00	50,946.60	
11	Horm. Zapata de Muros	9.60	Mt3	6,790.00	65,184.00	
12	Dinteles	3.52	Mt3	15,295.50	53,840.16	
13	Vigas Amarre	2.98	Mt3	15,295.50	45,580.59	
14	Columnas	2.56	Mt3	21,249.51	54,398.75	
15	Losa De Techo	1.00	Av	150,000.00	150,000.00	

Total Cubicado RD\$874,252.53

GASTOS INDIRECTOS

Seguro Social contra Accidentes	4.50	%	\$ 874,252.53	\$ 39,341.36	✓
Transporte	2.00	%	\$ 874,252.53	\$ 17,485.05	✓
Gastos Administrativos	2.00	%	\$ 874,252.53	\$ 17,485.05	✓
Fondo de Pensiones	1.30	%	\$ 874,252.53	\$ 11,365.28	✓
Dirección Técnica y Resp.	10.00	%	\$ 874,252.53	\$ 87,425.25	✓
Levantamiento Arq. Diseño, planos	3.50	%	\$ 874,252.53	\$ 30,598.84	✓

RD\$203,700.84

Deducción De Avance Inicial	33.00	%	\$ 708,975.01	\$ 233,961.75	✓
-----------------------------	-------	---	---------------	---------------	---

RD\$233,961.75

TOTAL A PAGAR EN CUBICACION #1

RD\$843,991.61


Revisado Por:

Arq. Yakira Paola De Moya
Directora Técnica

Elaborado Por:

Ing. Oscar R. Franco
Enc. De Cubicaciones

RECONSTRUCCION IGLESIA LOS VALERIOS

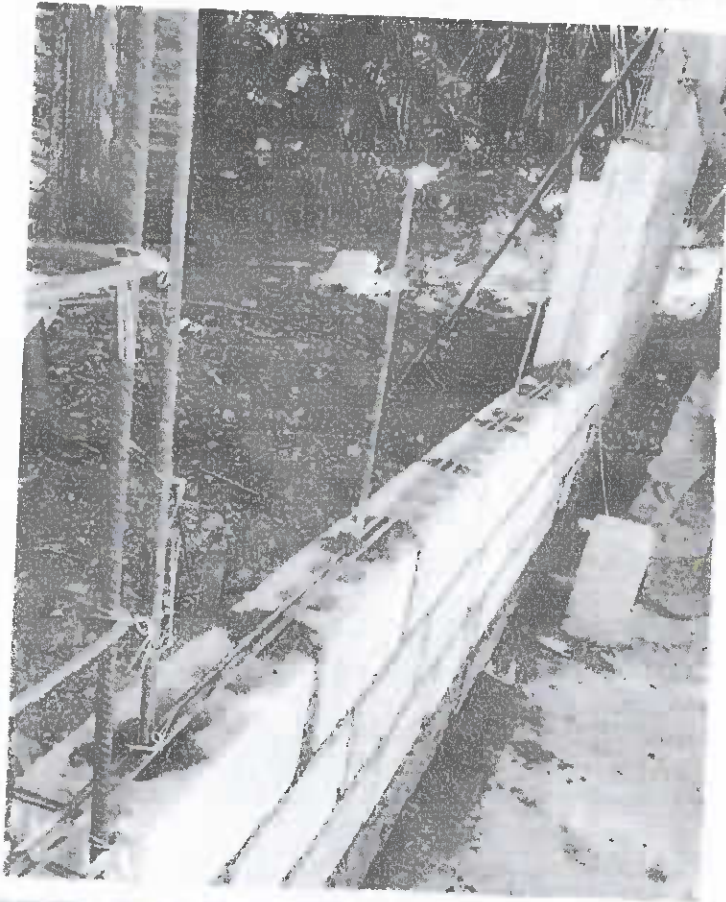

RECONSTRUCCION IGLESIA LOS VALERIOS



RECONSTRUCCION IGLESIA LOS VALERIOS





Ayuntamiento del Municipio de La Vega

Ciudad Cultura, Olimpica y Carnavalera

La Vega 03 Enero del 2022

Ing. Kelvin Cruz
Alcalde Municipal

Via: Inocencio Concepción
Enc. De Compras

CONTRATACION DE PERSONAS FISICAS O JURIDICAS PARA LA REALIZACION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA.

- AMPLIACION DE BADEN Y CANALIZACION DE RIO LOS CACAOS EL CABITO
- RECONSTRUCCION CENTRO COMUNAL DEL CLUB GUACO LA PINTA
- RECONSTRUCCION CLUB DE LAS MARAS
- CONSTRUCCION PARQUE DE LA SALUD ARBOLEDA (II)
- CONSTRUCCION DE BADENES E IMBORNALLES EN EL BARRIO INCU
- REMODELACION CUARTEL GENERAL CUERPO DE BOMBEROS
- DIGNIFICACION DEL CENTRO HISTORICO
- RECONSTRUCCION DE IGLESIA VILLA FRANCISCA (II)
- RECONSTRUCCION IGLESIA JAMO AFUERA
- RECONSTRUCCION IGLESIA LOS VALERIOS
- CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL LAS CANAS
- CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL NUEVA ERA LICEY
- CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL LOS HELECHOS SANTO CERRO
- CONSTRUCCION DE CANALITA EN CAMPAMENTO MUNICIPAL SOTA LA VEGA
- SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PINTURA EN 10 CANCHAS Y MUROS EN INSTALACIONES DE DEPORTIVAS Y CLUBES
- SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REMOZAMIENTO (TRABAJOS MENORES) DE CANCHAS, CLUBES E INSTITUCIONES PUBLICAS Y DE SERVICIOS
- CONSTRUCCION VERA PERIMETRAL CANCHA JIMAYACO
- REMOZAMIENTO EN PARQUE LA TORRE

Palacio Municipal, C/ Don Antonio Guzmán esq. Prof. Juan Bosch, La Vega, República Dominicana
Tel.: (809) 773-2351 / 240-2000 / Fax: (809) 571-8541
E-mail: ayuntamiento@ayuntamiento.la.vega.gub.do



Ayuntamiento del Municipio de La Vega

Ciudad Nueva, Olímpica y Camagüeyana

- ACONDICIONAMIENTO TERRENO PLAY Y LA SABANITA
- VERJA PERIMETRAL CANCHA LOS FOMOS
- CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE LA VEGA
- SOLUCION DRENAGE PLUVIAL LAS CAROLINAS
- RECONSTRUCCION FUENTE PARQUE PADRE FAUSTINO

Arq. Yakira Paola De Moya
Directora Técnica

000000000



No. EXPEDIENTE
CC-001
No. DOCUMENTO
ADM-CC-000000000

Página 1 de 1

Ayuntamiento Municipal de Concepción de La Vega

CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS
GERENCIA FINANCIERA

REQUERIMIENTO : DIRECCION TECNICA

FECHA : 13 de Enero del 2012

Yo, LIC. CAROLINA MOTA BUENO, en mi calidad de Encargada (a) Administrativo-Financiero del Ayuntamiento Municipal de Concepción de La Vega,

CONTIENIENDO:

Que esta Dirección Administrativo-Financiera cuenta con la dotación apropiada de fondos dentro del presupuesto del presente año 2012, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período ENERO para la adquisición que se especifica a continuación:

CONTRATACION DE PERSONAS FISICAS O JURIDICAS PARA LA REALIZACION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA

PRESUPUESTO : CIENTO OCHO MILLONES CON CINCO CIENTOS
(RD\$108.000.000,00)

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es Comparación de Precios.

Y para que conste, firmo la presente certificación.


LIC. CAROLINA MOTA BUENO

Encargada (a) Administrativo-Financiero



LA VEGA

CC: 0001

USINERO 2011

Al: Lic. Carolina Rodríguez
Gerente Municipal

De:
Inocencia C. Rodríguez
Esc. Del Departamento de Compras

El presente documento tiene el objetivo de convocar a todas las personas físicas o jurídicas que deseen
de participar para la realización de obras en el Municipio de La Vega.

Ante las presentes se declara:


Contratación de personas físicas o jurídicas para la realización de obras en el
Municipio de La Vega.

En la ciudad de La Vega,

al día 10 de mayo del 2011.

Inocencia C. Rodríguez
Esc. De Compras

Para la Municipalidad: ☐ Para el Municipio de La Vega: ☐ Para el Municipio de La Vega: ☐ Para el Municipio de La Vega: ☐



Ayuntamiento del municipio de La Vega

OFERTA ECONÓMICA

27 de enero de 2022

NOMBRE DEL OFERENTE:

LOTE	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida ¹	Cantidad ²	Precio Unitario	IBIS	OTROS IMPUESTOS	Precio Unitario Final
6	RECONSTRUCCION IGLESIA LOS VALERIOS	UND	1	RD\$ 3,431,068.06	RD\$ 63,807.00		RD\$ 3,544,875.06
VALOR TOTAL DE LA OFERTA: 3,544,875.06				RD\$			
Valor total de la oferta en letras: TRES MILLONES, QUINIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON SEIS CENTAVOS							

RESPONSABLE: ING. LUIS ALBERTO GIL JIMÉNEZ

en calidad de INGENIERO

debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de EL ING. LUIS ALBERTO GIL JIMÉNEZ.

Firma:

27 de enero de 2022

1. Sin
2. Sin

0001 2022

SECRETARÍA DE
GOBIERNO



PROYECTO: RECONSTRUCCION DE LA IGLESIA LOS VALERIOS.

PRESUPUESTO

ITEM	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
A) GASTOS DIRECTOS						
1.00	TRABAJOS PRELIMINARES					225,000.00
1.01	Limpieza del area	1.000	P.A.	15,000.00	15,000.00	
1.02	Corte de Arbustos, destronques varios	1.000	P.A.	100,000.00	100,000.00	
1.03	Demolicion de Muros	1.000	P.A.	100,000.00	100,000.00	
1.04	Replanteo de La Construcción	1.000	P.A.	10,000.00	10,000.00	
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA:					38,802.09
2.01	Excavacion de Zapata Columnas	12.500	M3	390.00	4,875.00	
2.02	Excavacion Zapata de Muros	8.750	M3	357.61	3,129.09	
2.03	Relleno Compactado	45.000	M3	524.40	23,598.00	
2.04	Bote de Material Inservible	18.000	M3	400.00	7,200.00	
3.00	HORMIGON ARMADO EN:					682,816.38
3.01	Chapapote	26.500	M3	7,754.73	205,500.21	
3.02	Calzada Perimetral	12.500	M3	7,754.73	96,934.06	
3.03	Zapata de Columnas	6.540	M3	7,790.00	50,946.60	
3.04	Zapata de Muros	9.600	M3	6,790.00	65,184.00	
3.05	Dinteles	3.520	M3	15,295.50	53,840.16	
3.06	Vigas de Amarre (0.20*0.15)	2.980	M3	15,295.50	45,580.59	
3.07	Columnas	2.560	M3	21,249.51	54,398.75	
3.08	Losas de Hormigon Armado	6.580	M3	16,782.98	110,432.01	
4.00	MUROS EN:					315,412.56
4.01	Muros de 6" BNP	125.500	M2	928.51	116,806.56	
4.02	Muros de 6" SNP	236.500	M2	844.00	199,606.00	
5.00	TERMINACION DE SUPERFICIE					269,271.78
5.01	Fraguache en Gral	575.500	M2	67.39	38,782.95	

5.02	Pañete en Muros Interiores y Ext.					
5.03	Pañete en Techo	M2	575.500	312.19	179,665.35	
5.04	Cantos	M2	25.500	340.57	8,684.54	
5.05	Mocheta	Ml	239.500	72.85	17,447.58	
5.06	Gotero en Techo	Ml	184.500	72.85	13,440.83	
5.07	Fino de Techo	Ml	28.000	60.10	1,682.80	
5.08	Zabaleta de Techo	M2	25.000	325.14	8,128.50	
		Ml	15.000	95.95	1,439.25	

6.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

180,037.33

6.01	Luces Genitales	UND	9.000	835.88	7,522.92
6.02	Lamparas Fluorescentes de 40 w	UND	10.000	1,753.75	17,537.50
6.03	Luces en Area Ext.	UND	6.000	3,500.00	21,000.00
6.04	Interruptores Sencillos	UND	4.000	982.80	3,931.20
6.05	Interruptores Dobles	UND	3.000	1,444.80	4,334.40
6.06	Interruptores Triples	UND	1.000	1,704.00	1,704.00
6.07	Porta Contador con Main Breakers	UND	1.000	956.63	956.63
6.08	Tomacorriente 110v	UND	12.000	1,004.69	12,056.28
6.09	Panel de Distribucion	UND	1.000	10,994.40	10,994.40
6.10	Materia Diversos	UND	1.000	100,000.00	100,000.00

7.00 INSTALACIONES SANITARIAS

219,496.13

7.01	Inodoro	UND	3.000	6,237.00	18,711.00
7.02	Lavamanos	UND	3.000	7,461.30	22,383.90
7.03	Conexiones alcantarillado Sanitario	UND	1.000	16,500.00	16,500.00
7.04	Camara de inspeccion	UND	1.000	5,184.00	5,184.00
7.05	Tuberias de Arrastre	UND	78.000	200.10	15,607.80
7.06	Bajante de Techo Tipo Campana	Ml	12.000	235.40	2,824.80
7.07	Caños	Ml	68.000	243.34	16,547.12
7.08	Desague de Piso	UND	3.000	538.39	1,615.17
7.09	Desague de Techo	UND	6.000	538.39	3,230.34
7.10	Deposito de Agua Potable	UND	1.000	15,000.00	15,000.00
7.11	Llave de Chorro en Area Exterior	UND	2.000	946.00	1,892.00
7.12	Materiales Diversos	P.A	1.000	100,000.00	100,000.00

8.00 PINTURA					113,792.50	
8.01	Sellador Primario	575.000	M2	85.70	49,277.50	
8.02	Acrilica en Muros Int. Y Ext.	575.000	M2	112.20	64,515.00	
9.00 HERRERIA GENERAL					162,731.60	
9.01	Colocacion de Proteccion en Puerta y Ventana	295.500	P2	295.20	87,231.60	
9.02	Desinstalacion del Techo e Instalacion	1.000	P.A.	150,000.00	150,000.00	
9.03	Hierros en Verjas Perimetral	1.000	P.A.	125,000.00	125,000.00	
10.00 PUERTAS					50,494.40	
10.01	Polimetal	8.000	UND	6,311.80	50,494.40	
11.00 TERMINACION DE PISOS					251,685.73	
11.01	Pisos de Ceramica Criolla (0.40*0.40)	195.000	M2	1,042.70	203,326.50	
11.02	Zocalo de Ceramica	112.500	ML	216.54	24,360.75	
11.03	Ceramica de Pared de Baño	28.000	m2	855.66	23,958.48	
12.00 MISCELANEOS					165,000.00	
12.01	Imprevistos	1.000	P.A.	150,000.00	150,000.00	
12.02	Limpieza Final	1.000	P.A.	15,000.00	15,000.00	
SUB-TOTAL					2,875,000.49	
14.00 B)GASTOS INDIRECTOS						
14.01	Seguro Social contra accidentes	4.5%			129,375.02	
14.02	Transporte	2.0%			57,500.01	
14.03	Gastos Administrativos	2.0%			57,500.01	
14.04	Fondo de Pensiones	1.3%			37,375.01	
14.05	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.0%			287,500.05	
14.06	Levantamiento Arc. Plano y Presupuesto	3.5%			100,625.02	
SUB-TOTAL					669,875.11	
TOTAL GRAL.					3,544,875.60	
