

OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL

AÑO 2025


CANTIDAD RD\$ 10,239,815.44

N°	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO		% DE AVANCE	ESTADO
			PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO		
01	Vaciado de calle y construccion callejones	sector San Francisco	444,322.78	444,322.78	100%	finalizado
02	Construccion de aceras y contenes	Calle Ezequier Pimentel	565,626.60	565,626.60	100%	finalizado
03	Vaciado de Callejon	Sector Tamarindo	545,361.86	434,361.86	80%	en proceso
04	Vaciado de Callejon 3ra. Etapa	Sector Sabana Gde.	499,453.20	499,453.20	100%	finalizado
05	Construccion de Canaleta y Contenes	Comunidad el Limon	1,500,000.00	351,600.00	23%	en proceso
06	Rotulacion de Calles	Municipio de Ocoa	800,000.00	0.00	0%	pendiente
07	Reparacion y acondicionamiento de vias de comunicaci3n	Municipio de Ocoa	500,000.00	500,000.00	100%	finalizado
08	Construccion de aceras y contenes	Sector San Luis	684,051.00	0.00	0%	pendiente
09	Construccion de aceras y contenes	Pueblo Abajo	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	finalizado
10	Construccion de aceras y contenes	las yessicas	1,080,987.50	1,080,987.50	100%	finalizado
11	Reparacion e Instalacion de Semaforos	Municipio de Ocoa	201,000.00	201,000.00	100%	finalizado
12	Construccion de Vivienda	Municipio de Ocoa	800,000.00	800,000.00	100%	finalizado
13	Barrio San luis		1,507,474.80	1,507,474.80	100%	finalizado

ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO


1. Balance consolidado de la ejecucion del Presupuesto Participativo año 2025

Estado de situacion de la las obras	Cantidad	porcentaje %
Obras ejecutadas	09	69%
Obras en proceso	02	15%
Obras pendientes	02	15%
TOTAL	13	100%

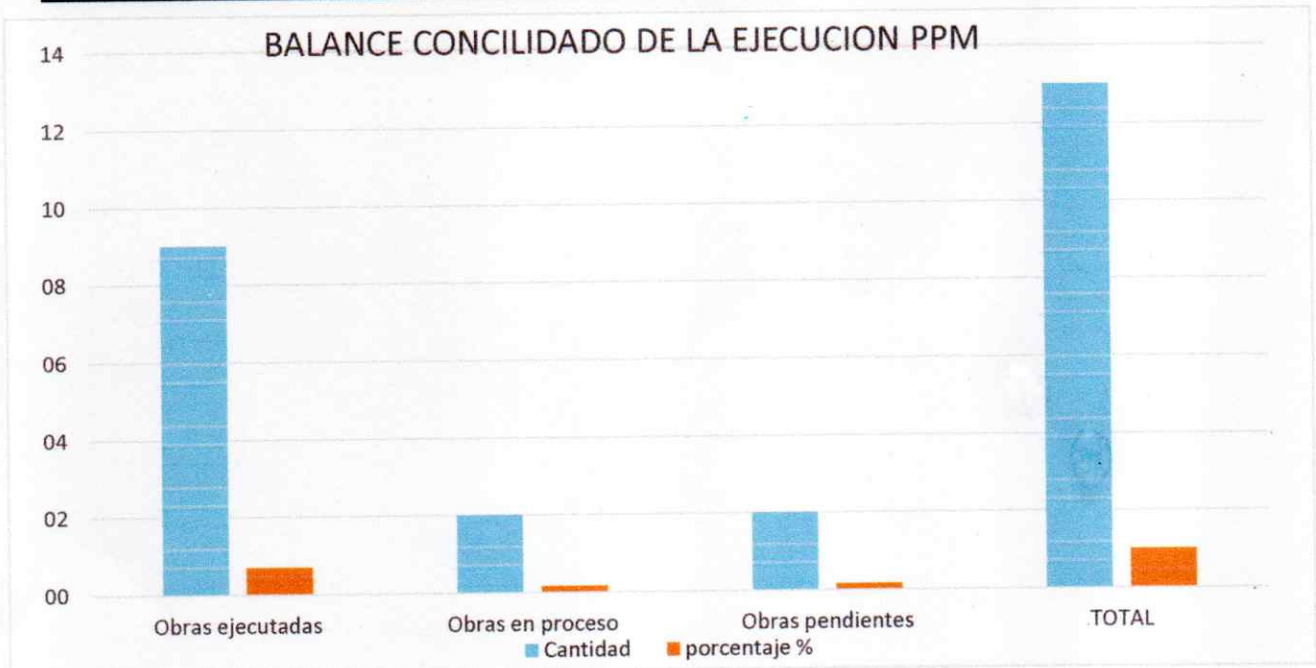

2. Balance de ejecucion del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo Municipal año 2025

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversion ejecutada y FDF	porcentaje de ejecucion %
10,239,815.44	7,384,826.74	2,854,988.70	72%


 Rafael Menendez
 Enc. Depto. PPM

