


OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO

Informe Niveles, Avances de Obras (Enero-Marzo 2023)

OBRAS PROGRAMADAS PARA EJECUCION	PRESUPUESTO		AVANCES			OBSERVACIONES
	Estimado	Ejecutado	50 %	80 %	100 %	
Acondicionamiento de la Capilla Comunitaria, Arroyo Seco	50,000	56,210.00			✓	Terminada
Materiales de Contruccion, acondicionamiento del puente Comajon, Los Robles	50,000	60,535.25	-	-	✓	Terminada
Construcción Contenes y badenes de la calle principal del sector , Urb. Julian Javier II	56,000	61,216.00			✓	Terminada


a) Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo Municipal Tenares (Primer Trimestre 2023).

Estado de situación obras PPM-2023	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas y entregadas	3	13%
Obras en proceso de ejecucion	3	13%
Obras pendientes de ejecucion	18	75%
TOTAL	24	100%

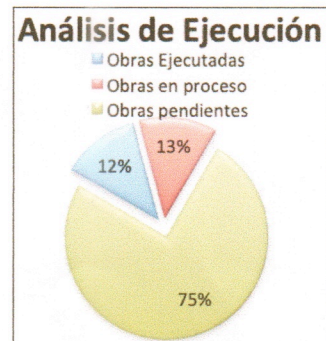

b) Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo Municipal Tenares (Primer Trimestre 2023).

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
RD\$ 1,550,000.00	RD\$ 177,961.25	RD\$ 1,372,038.75	% 11.48

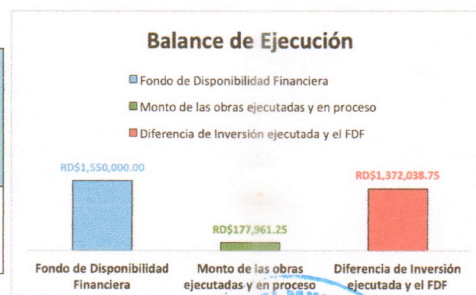


JOSÉ LUIS MARTÍNEZ ROSA
Encargado de Planeamiento Urbano.

