



REPORTE TRIPESTRAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS / PROYECTOS

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL – PPM 2025

TRIMESTRE: ABRIL – JUNIO, 2025

Dirigido a : Comité de Seguimiento y Control Presupuesto Participativo

Elaborado : Oficina de Planeamiento Urbano / Oficina de Planificación

Referido : Doctora Raquel Rosanna Rosario, Alcaldesa Municipal

I. INTRODUCCIÓN

Este informe presenta el avance físico y financiero de los proyectos priorizados en el marco del Presupuesto Participativo Municipal (PPM) correspondiente al **segundo trimestre del año 2025**.


Su propósito es facilitar el seguimiento y control por parte del Comité, conforme a los principios de transparencia, participación y eficiencia en la gestión pública.

II. Resumen General de Ejecución Trimestral

OBRAS / PROYECTOS	SECCIÓN / COMUNIDAD	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)	PRESUPUESTO EJECUTADO (RD\$)	% DE AVANCE	ESTADO DE EJECUCIÓN
Adquisición colocación de lámparas LED.	La Ceiba	480,000.00	235,882.00	49.14%	Ejecutada 50%
Adquisición y colocación de lámparas LED.	Santa Ana	480,000.00	235,882.00	49.14%	Ejecutada 50%
Adquisición y colocación de lámparas LED.	San José	480,000.00	235,882.00	49.14%	Ejecutada 50%
Construcción de rampas de acceso.	Zona Urbana	80,000.00	20,000.00	25.00%	En proceso
Acondicionamiento centro comunitario e Iglesia Católica	Los Limones	240,000.00	247,982.00	103.33 %	Terminada a 100%
colocación de alcantarilla sector Los Limones	Los Limones	240,000.00	248,340.00	103.48 %	Terminada a 100%



a. Grafico de Nivel de Avance por Proyecto Abril-Junio -2025

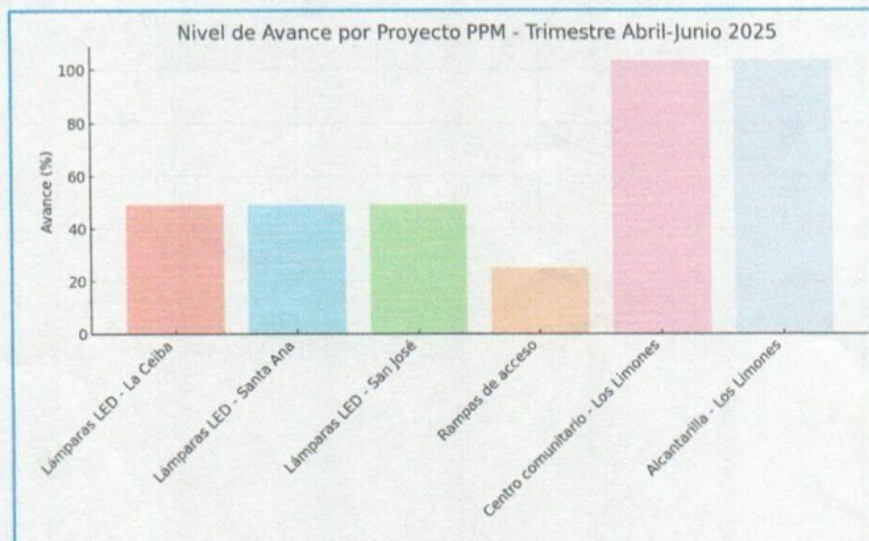

III. ESTADO GENERAL DE LA EJECUCIÓN


Con base en el seguimiento técnico y administrativo realizado por el Ayuntamiento Municipal de Villa Tapia durante el período enero–junio del año 2025, se presenta el resumen consolidado del estado de ejecución de las seis (6) obras aprobadas en el marco del Presupuesto Participativo Municipal (PPM–2025).

a. Tabla estado de ejecucion semestral PPM- 2025

CATEGORÍA	CANTIDAD DE OBRAS	% AVANCES
Obras Ejecutadas 100%	2	33 %
Obras en Proceso de Ejecución	4	67 %
Obras Pendientes por Iniciar	0	0 %
Total de Obras Programadas	06	100%



b. Gráficos Estado de Ejecución de Obras Abril-Junio-2025

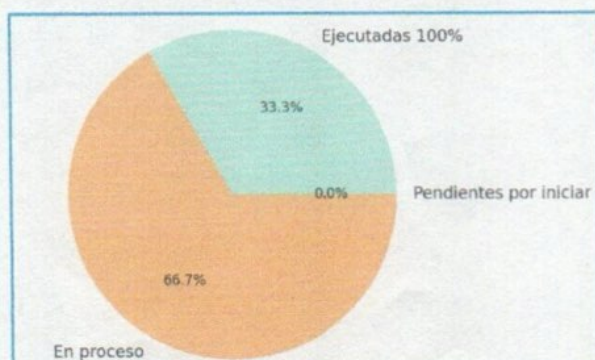


Durante el período enero-junio del año 2025, el Ayuntamiento Municipal de Villa Tapia dispuso de un monto total asignado de RD\$ 2,000,000.00 para la ejecución de los proyectos priorizados mediante el Presupuesto Participativo Municipal 2025.

a. Balance Financiera General PPM-2025

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	VALOR RD\$
Fondo Asignado PPM-2025	2,000,000.00
Presupuesto Ejecutado a la fecha	1,203,968.00
Diferencia de Inversión	796,032.00
Nivel de Avance %	60%

b. Grafico Balance Financiera Enero-Junio PPM-2025

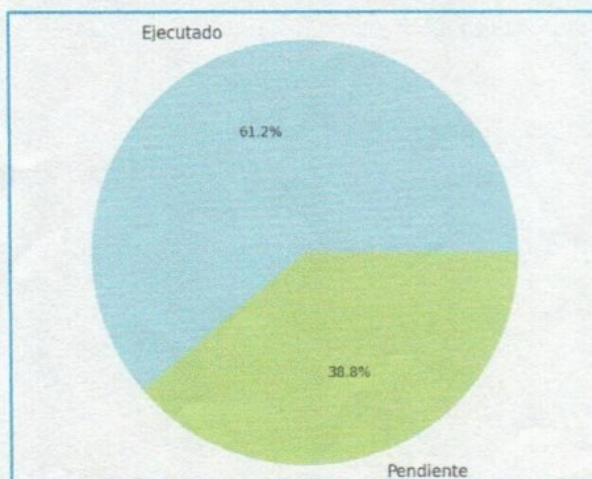



V. FIRMA DEL EQUIPO TÉCNICO Y AUTORIDADES

Para constancia de lo expuesto en el presente **Informe Trimestral de Avance de Ejecución de Obras correspondiente al Presupuesto Participativo Municipal (PPM-2025), período Abril-Junio**, suscriben el mismo las autoridades municipales y responsables técnicos, en señal de conformidad y compromiso con la transparencia, la planificación y el desarrollo Social del municipio de Villa Tapia

Arq. Edwin Castillo
Enc. de Planeamiento Urbano

Ing. Héctor Vásquez
Enc. Presupuesto Participativo

Ing. Israel Rodríguez Mercado
Acesor General | OMPP
Comun.

Rosanna Mercedes Duran
Enc. Desarrollo Social y

Dra. Raquel Rosanna Rosario
Alcaldesa Municipal

Licda. Leonela Jazmin Sosa
Enc. Div. Financiera-Tesorería



ACTA DE ENTREGA

REPORTE TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL, SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO) 2025.

En el municipio de Villa Tapia, provincia Hermanas Mirabal, a los once (11) días del mes de junio del año dos mil veinticinco (2025), siendo las once y treinta de la mañana (11:30 a.m.), se reunieron en el salón de sesiones del Ayuntamiento Municipal de Villa Tapia los miembros del **Comité de Seguimiento y Control del Presupuesto Participativo Municipal**, con el objetivo de **recibir formalmente el Reporte Trimestral de Ejecución de Obras** correspondiente al segundo trimestre (abril-junio) del año 2025.

El informe fue entregado por la **Dra. Raquel Rosanna Rosario**, Alcaldesa Municipal, junto al **equipo técnico del ayuntamiento**, quienes resaltaron los avances logrados en la ejecución de los proyectos priorizados a través del Presupuesto Participativo Municipal 2025, reafirmando el compromiso institucional con la transparencia y la participación ciudadana.

Una vez revisado el documento, los miembros del Comité procedieron a firmar la presente acta en señal de **recepción conforme y compromiso de continuar el seguimiento activo a las obras en ejecución**

FIRMAS DE RECEPCION.

Comité de Seguimiento y Control Municipal del Presupuesto Participativo 2025

NOMBRES Y APELLIDOS	FUNCION	FIRMA
Wenseslao Casimiro Gonzalez	Presidente	
Ramon Reyes Álvarez	Miembro	
Alba Nuris Sosa	Miembro	
Rosa Simó E.	Miembro	

FIRMAS DE EQUIPO TECNICO DEL AYUNTAMIENTO

Arq. Edwin Castillo
Enc. de Planeamiento Urbano

Ing. Héctor Vásquez
Enc. Presupuesto Participativo

Ing. Israel Rodríguez Mercado
Acesor General OMPP

Dra. Raquel Rosanna Rosario
Alcaldesa Municipal

Rosanna Mercedes Duran
Enc. Desarrollo Social y Comun.

Licda. Leonela Jazmin Sosa
Enc. Division Financiera-Tesoreria



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

LISTADO DE ASISTENCIA

REUNION



ENTREGA DE REPORTE TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL, SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO) 2025

Dirigido a:

➤ COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

Lugar de realización del actividad :

SALON MULTIUSOS AYUNTAMIENTO DE VILLA TAPIA

Fecha :

11 DE JULIO 2025

Municipio:

VILLA TAPIA

Hora inicio:

11:30 A.M.

Hora Finalizacion:

12:00 P.M

NOMBRES Y APELLIDOS	GENERO	FUNCION	FIRMA
Wenseslao Casimiro Gonzalez	M	Presidente Comite de Seguimiento	
Ramon Reyes Álvarez	M	Miembro CSCM-PPM-2025	
Alba Nuris Sosa	F	Miembro CSCM-PPM-2025	
Rosa Simó E.	F	Miembro CSCM-PPM-2025	
Raquel Rosanna Del Milagro Rosario	F	Alcaldesa Municipal	
Leonela Jazmin Sosa Pozo	F	Enc. Tesoreria Municipal	
Hector Manuel Vasquez Quezada	M	Enc. Presupuesto Participativo	
Rosanna Mercedes Duran	F	Enc. Desarrollo Social y Participacion Comunitaria	
Edwin Manuel Castillo Henrriquez	M	Enc. Planeamiento Urbano	
Israel Rodriguez Mercado	M	Asesor General OMPP.	
