


**OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO**  
**INFORME FINAL PARTICIPATIVO 2022**  
**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL (ENERO-DICIEMBRE 2022)**


**A. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo municipio Tenares para el año 2022**

Estado de situación obras PPM-2022	Cantidad de Obras Proyectos	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	18	100 %
Obras en proceso	0	0 %
Obras pendientes	0	0 %
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>100 %</b>



**B. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo Municipal Tenares del año 2022.**

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
RD\$ 1,500,000.00	RD\$ 1,724,832	RD\$ 224,832	115%

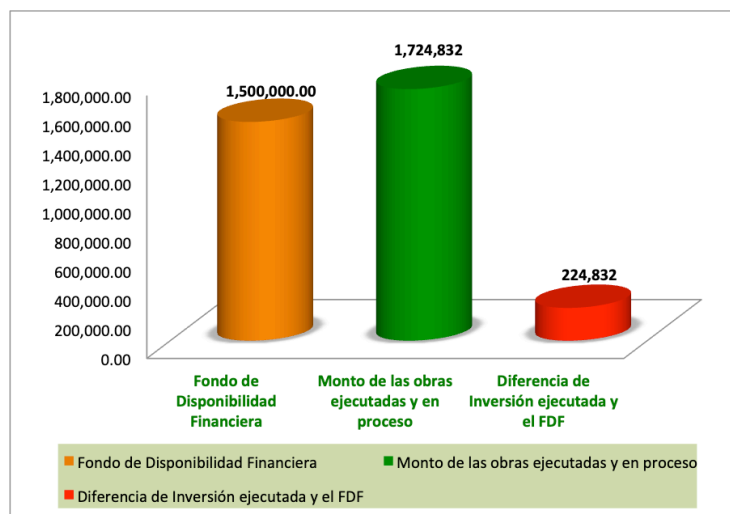

**OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO**  
**INFORME PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**

**Matriz niveles de avances obras**

**INFORME FINAL ANUAL PPM-2022 - TERCER TRIMESTRE**

OBRAS PROGRAMADAS PARA EJECUCION	Presupuesto	Presupuesto	Nivel de Avance			OBSERVACIONES
	Estimado	Ejecutado	50 %	80 %	100 %	
Materiales de Construcción para de Tranquilla Rural Los Guayos	60,000	60,748	-	-	✓	TERMINADA
Materiales de Construcción I Acueducto Rural de la Comunidad La Amapola	60,000	63,600	-	-	✓	TERMINADA
Postes para Tendido Electrico de (30 Ft) Corozal Al Medio	75,000	50,400	-	-	✓	TERMINADA
Barandillas Sobre los Puentes de Alcantarilla de la Comunidad Curva Dura	60,000	60,000	-	-	✓	TERMINADA
Acondicionamiento de Techo y Puertas del Centro Comunitario Cigua	60,000	74,448	-	-	✓	TERMINADA
Acondicionamiento de Sillas en Hierro y Madera de la Capilla Paso Hondo	75,000	90,000	-	-	✓	TERMINADA
Puertas y Ventanas de Capilla Comunitaria El Placer	90,000	104,000	-	-	✓	TERMINADA
Colocación de Plafón de la Capilla Comunitaria La Jaguila	100,000	146,008	-	-	✓	TERMINADA
Acondicionamiento de Camino Vecinal (Puntos Críticos) Blanquito	60,000	77,464.50	-	-	✓	TERMINADA
Materiales de Construcción para Zapata Centro Comunitario Loma de Agua	100,000	96,000.00	-	-	✓	TERMINADA
Materiales de Construcción para Centro Comunitario Canete	210,000	192,800.00	-	-	✓	TERMINADA
Acondicionamiento de camino vecinal de la Comunidad Los Guazaros	90,000	190,275.00	-	-	✓	TERMINADA
Acondicionamiento de los Caminos Vecinales Rio Abajo, Maco El Bambu	60,000	66,009.30	-	-	✓	TERMINADA
Acondicionamiento de Camino que comunica Los Pomos I con Los Pomos II	80,000	84,307.02	-	-	✓	TERMINADA
Acondicionamiento del Camino Vecinal el Gajo abajo Corozal Abajo	70,000	79,657.50	-	-	✓	TERMINADA
Acondicionamiento de la Calle Principal Arroyo seco	100,000	117,648.00	-	-	✓	TERMINADA
Acondicionamiento de Camino Vecinal Los Then	100,000	116,325.75	-	-	✓	TERMINADA
Acondicionamiento Camino Vecinal de la Comunidad Loma Azul	50,000	55,141.05	-	-	✓	TERMINADA

**José Luis Martínez Rosa**  
Encargado de Planeamiento Urbano

