


**OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO**  
**INFORME PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022**  
**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**  
**(ENERO / JUNIO 2022)**

**A. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo municipio Tenares para el año 2022**


Estado de situación obras PPM-2022	Cantidad de Obras   Proyectos	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	08	45%
Obras en proceso	02	10%
Obras pendientes	08	45%
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>100 %</b>

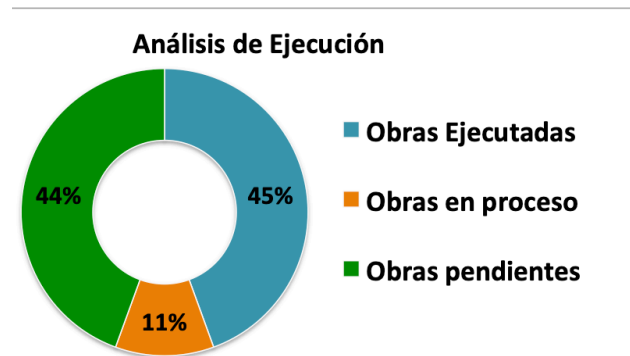

**B. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo Municipal Tenares del año 2022.**

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
RD\$1,500,000.00	RD\$ 649,205.37	RD\$ 850,794.63	43%

**Balance de Ejecución de Obras**

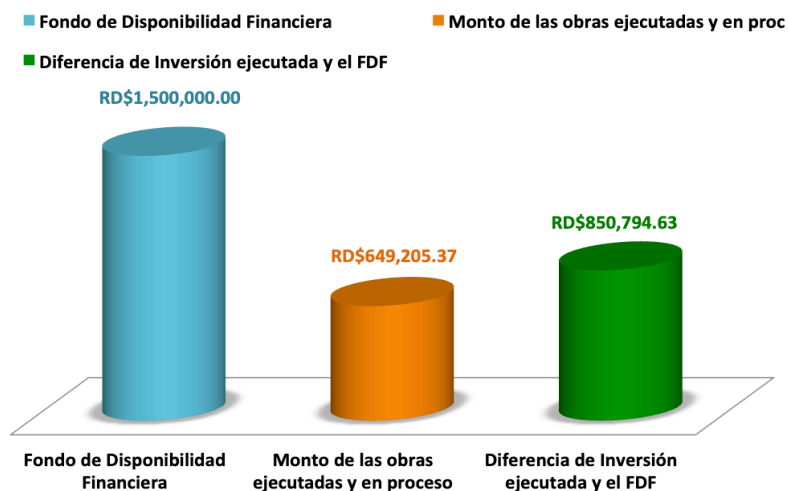

**OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO**  
**INFORME PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**  
**MATRIZ NIVELES DE AVANCES OBRAS PPM-2022**  
**Trimestre ( Enero - Junio 2022)**

OBRAS PROGRAMADAS PARA EJECUCION	Presupuesto	Presupuesto	Nivel de Avance			OBSERVACIONES
	Estimado	Ejecutado	50 %	80 %	100 %	
Materiales de Construcción para de Tranquilla Rural Los Guayos	60,000	60,748.85	-	-	X	TERMINADA
Materiales de Construcción I Acueducto Rural de la Comunidad La Amapola	60,000	63,600.47	-	-	X	TERMINADA
Postes para Tendido Electrico de (30 Ft) Corozal Al Medio	75,000	50,400.00	-	-	X	TERMINADA
Barandillas Sobre los Puentes de Alcantarilla de la Comunidad Curva Dura	60,000	60,000.00	-	-	X	TERMINADA
Acondicionamiento de Techo y Puertas del Centro Comunitario Cigua	60,000	74,448.25			X	TERMINADA
Acondicionamiento de Sillas en Hierro y Madera de la Capilla Paso Hondo	75,000	90,000.00			X	TERMINADA
Puertas y Ventanas de Capilla Comunitaria El Placer	90,000	104,000.00			X	TERMINADA
Colocación de Plafón de la Capilla Comunitaria La Jagüita	100,000	146,007.80			X	TERMINADA
Acondicionamiento de los Caminos Vecinales Rio Abajo, Maco El Bambu	60,000					---
Acondicionamiento de Camino Vecinal (Puntos Críticos) Los Then	60,000					---
Acondicionamiento de Camino que comunica Los Pomos I con Los Pomos II	80,000					---
Materiales de Construcción para Zapata Centro Comunitario Loma de Agua	100,000					---
Materiales de Construcción para Centro Comunitario Canete	210,000					---
Acondicionamiento del Camino Vecinal el Gajo abajo Corozal Abajo	70,000					---
Acondicionamiento de camino vecinal de la Comunidad Los Guazaros	90,000					---
Acondicionamiento de la Calle Principal Arroyo seco	100,000					---
Acondicionamiento de Camino Vecinal Los Then	100,000					---
Acondicionamiento Camino Vecinal de la Comunidad Loma Azul	50,000					---

  
**José Luis Martínez Rosa**  
Encargado de Planeamiento Urbano.

