

Continuando con los trabajos correspondientes al área de Seguridad y Salud en el Trabajo de este Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA), en esta oportunidad presentamos el Informe de levantamiento de los extintores ubicados en nuestra Sede Central.


La Sede Central cuenta actualmente con 8 extintores, distribuidos entre sus dos niveles y en las áreas periféricas, según se muestra en la siguiente tabla:

	LUGAR DE COLOCACIÓN	TIPO DE EXTINTOR	CAPACIDAD	CÓDIGO
1	Pasillo de Recursos Humanos	ABC	10 libras	674987
2	Tecnología	Halotron	20 libras	674863
3	Pasillo entrada Frente a recepción	ABC	10 libras	674508
4	Patio frente a seguridad (marquesina)	ABC	10 libras	674674
5	Patio (Frente a Suministro)	ABC	10 libras	708433
6	Patio frente a la planta eléctrica	CO2	20 libras	674818
7	Pasillo hacia Dpto. de Pensiones (2do nivel)	ABC	10 libras	674086
8	Pasillo Frente a Dpto. de Compras (2do nivel)	ABC	10 libras	708219

### Hallazgos y recomendaciones:

- La totalidad de extintores cuenta ya con el tiempo mínimo recomendable para la realización de un mantenimiento preventivo oportuno de 1 año, contados a partir del último mantenimiento realizado (enero 2022). Se recomienda dar mantenimiento a todos los extintores de la Sede.
- **EN ESTADO CRÍTICO** presentamos los extintores códigos: 708433 y 674086, ubicados en el Patio (Frente a Suministro) y el Pasillo hacia Dpto. de Pensiones (2do nivel) respectivamente, por **NO CONTAR** con presión suficiente, en caso de ser necesitados.
- El extintor código 674818, ubicado en EL Patio, frente a la planta eléctrica, no cuenta con etiqueta de control de mantenimiento, ni con manómetro; para la visualización de la presión del mismo. En ese mismo orden se apreciar que la visualización de este se encuentra obstruida por dos plantas ornamentales que les rodean. Se recomienda retirar las plantas ornamentales y dar visibilidad al extintor.
- Retomamos la recomendación realizada en agosto de 2022, de dotar de un extintor ACB próximo al departamento financiero.

Imágenes relacionadas:

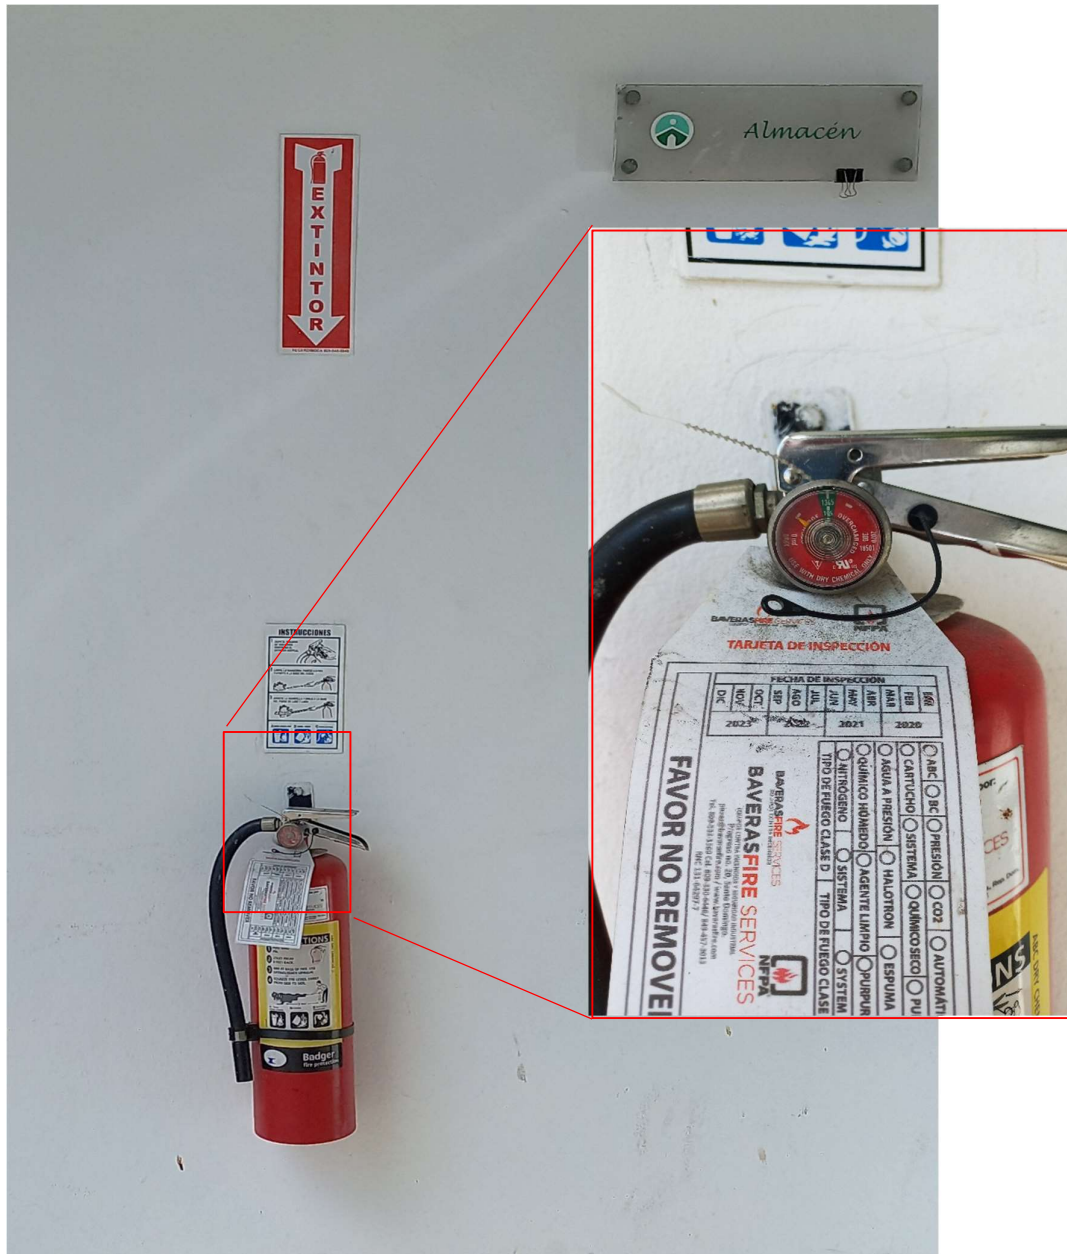

Extintor 708433  
Patio (Frente a Suministro)



Extintor 674086  
Pasillo hacia Dpto. de Pensiones (2do nivel)





Extintor 674818  
Patio, frente a la planta eléctrica.



Informe levantamiento extintores  
 Sede Central.

INABIMA  
 INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGISTERIAL  
 Check List Extintores

LEVANTAMIENTO EXTINTORES SEDE CENTRAL

Fecha de verificación  
 Responsable

2/2/2023  
 Nelson Ruiz

	LUGAR DE COLOCACIÓN	TIPO DE EXTINTOR	CAPACIDAD	CODIGO	PRESIÓN	CONDICIONES DE LA MANGUERA	FECHA DE LLENADO
1	Pasillo de Recursos Humanos	ABC	10 libras	674987	OK	OK	En. 22
2	Tecnología	Halotron	20 libras	674863	OK	OK	En. 22
3	Pasillo entrada xxxx <i>Funk Books</i>	ABC	10 libras	674508	OK	OK	En. 22
4	Patio frente a seguridad <i>(Magisterial)</i>	ABC	10 libras	674674	OK	OK	En. 11
5	Patio (Suministro) <i>Front a Serran</i>	ABC	10 libras	708433	NO	OK	0 11
6	Patio frente a la planta eléctrica	CO2	20 libras	674818	NO-A	OK	no estig
7	Pasillo Pension <i>del mural</i>	ABC	10 libras	674086	NO	OK	En. 22
8	Pasillo Compras <i>Front a compras del mural</i>	ABC	10 libras	708219	OK	OK	En. 22
9	Departamento Financiero <i>?</i>						
10							
11							
12							
13	<i>Vinodiana</i>						
14							
15	<i>7 y 8 Argoson</i>						
16							
17							
18							
19							
20							

*Requiere por planta Guaranes 2 libras*

*7 y 8 Argoson Bagnille de nylon a base.*
