



Id	Modo de tarea	% completado	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesora	3er trimestre		4º trimestre			1er trimestre
								ago	sep	oct	nov	dic	ene
1		17%	Certificación del SG de SST en CORAASAN	98.5 días	mié 8/9/21	lun 24/1/22							
2	✓	100%	Fase I. Planificación y organización del proyecto	8.5 días	mié 8/9/21	lun 20/9/21							
3	✓	100%	Reunión de inicio - kick off	0.5 días	mié 8/9/21	mié 8/9/21							
4	✓	100%	Revisión y ajuste del cronograma	1 día	mié 8/9/21	jue 9/9/21	3						
5	✓	100%	Diagnóstico general de situación actual en materia de SSO	1 día	mar 14/9/21	mié 15/9/21	4FC+3 días						
6	✓	100%	Informe inicial	3 días	mié 15/9/21	lun 20/9/21	5						
7		12%	Fase II. Ejecución de requisitos para programa de SST	79 días	vie 24/9/21	jue 13/1/22							
8		90%	Actualización y/o formación legal de los comités mixtos de SSO	3 días	vie 24/9/21	mié 29/9/21	6FC+4 días						
9		0%	Presentación de los Comités Mixtos al Ministerio de Trabajo	5 días	mié 29/9/21	mié 6/10/21	8						
10		60%	Revisión e identificación de procesos y puestos de trabajo en CORAASAN	5 días	mié 6/10/21	mié 13/10/21	9						
11		30%	Propuesta y socialización de herramienta y metodología para identificación de peligros y evaluación de riesgos	3 días	mié 13/10/21	lun 18/10/21	10						
12		0%	Identificación de peligros por procesos y puestos de trabajo	10 días	lun 18/10/21	lun 1/11/21	11						
13		0%	Análisis y evaluación de riesgos por procesos y puestos de trabajo	20 días	lun 1/11/21	lun 29/11/21	12						

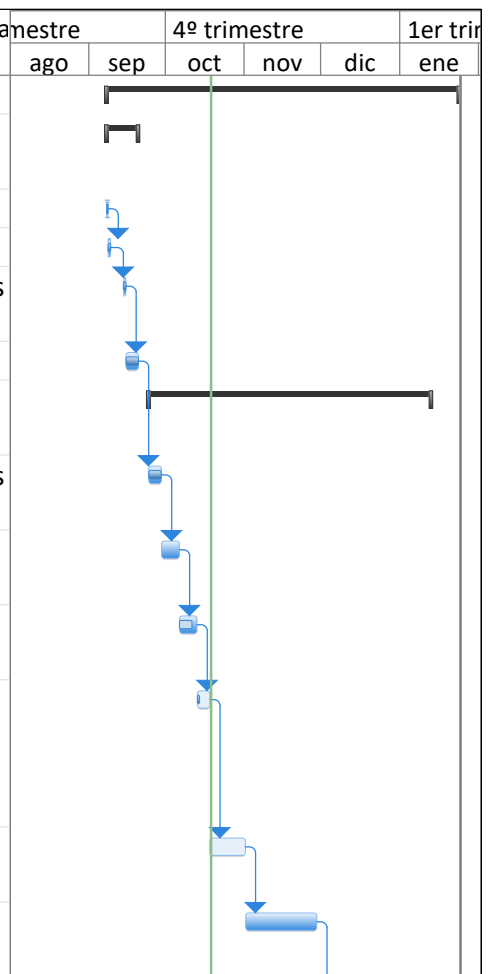

Project: msproj11
Date: mar 19/10/21

Task		Inactive Task		Start-only	
Split		Inactive Milestone		Finish-only	
Milestone		Inactive Summary		Deadline	
Summary		Manual Task		Progress	
Project Summary		Duration-only		Manual Progress	
External Tasks		Manual Summary Rollup			
External Milestone		Manual Summary			

Id	Modo de tarea	% completado	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesora	3er trimestre		4º trimestre			1er trimestre
								ago	sep	oct	nov	dic	ene
14		30%	Elaboración del Programa de SST basado en los requerimientos del reglamento 522-06	10 días	lun 29/11/21	lun 13/12/21	13						
15		0%	Presentación del Programa de SST al Ministerio de Trabajo	5 días	lun 13/12/21	lun 20/12/21	14						
16		0%	Preparación del plan de implementación del SG-SST	5 días	lun 20/12/21	lun 27/12/21	15						
17		0%	Divulgación del plan de implementación	3 días	lun 27/12/21	jue 30/12/21	16						
18		0%	Seguimiento a las acciones derivadas del Programa de SST	10 días	jue 30/12/21	jue 13/1/22	17						
19		0%	Fase III. Cierre del proyecto	7 días	jue 13/1/22	lun 24/1/22							
20		0%	Informe final consolidado	3 días	jue 13/1/22	mar 18/1/22	18						
21		0%	Reunión de cierre del proyecto	0.5 días	mar 18/1/22	mar 18/1/22	20						
22		0%	Evaluación final del proyecto	0.5 días	lun 24/1/22	lun 24/1/22	21						

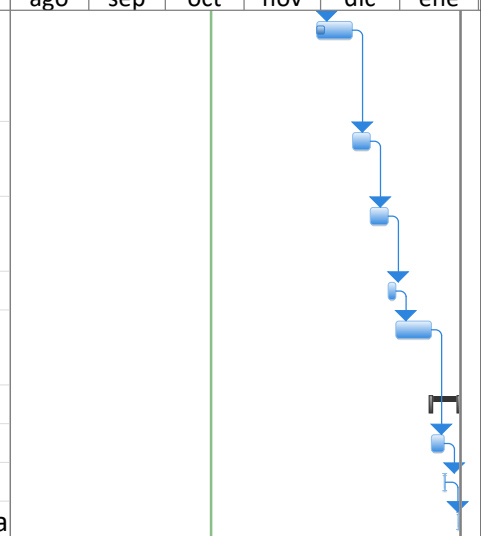

Project: msproj11
Date: mar 19/10/21

Task		Inactive Task		Start-only	
Split		Inactive Milestone		Finish-only	
Milestone		Inactive Summary		Deadline	
Summary		Manual Task		Progress	
Project Summary		Duration-only		Manual Progress	
External Tasks		Manual Summary Rollup			
External Milestone		Manual Summary			
